

Служба автомобільних доріг у Рівненській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 518228,353 тис. грн

в тому числі:

виконані роботи 65996,916
залишки робіт 452231,437

Зокрема зворотних сум 283,717 тис. грн

в тому числі:

виконані роботи 0,000
залишки робіт 283,717

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ № (з виконанням)

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території				
1	01-01	Підготовчі роботи+ в тому числі: виконані роботи залишки робіт	8098,776 3581,404 4517,372	-	-	8098,776 0,000 3581,404 4517,372
2	01-03	Підготовчі роботи /відновлювальні роботи/	21,656	0,000	0,000	21,656
3	01-02	Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги+ в тому числі: виконані роботи	80,618 0,000	-	-	80,618 0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		залишки робіт	80,618			80,618
4		Том 6.3 Реконструкція мереж газопостачання	2086,155	-	-	2086,155
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	2079,086			2079,086
		залишки робіт	7,069			7,069
5		Том 6.4 Реконструкція мереж газопостачання	182,907	-	-	182,907
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	182,907			182,907
		залишки робіт	0,000			0,000
6	01-03	Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання	3463,631	-	-	3463,631
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	3441,313			3441,313
		залишки робіт	22,318			22,318
6	01-04	Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна+	23556,609	-	-	23556,609
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	23556,609			23556,609
7	01-05	Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"+	1215,134	-	-	1215,134
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	1215,134			1215,134
8	01-06	Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»	103,999	-	-	103,999
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	103,999			103,999
9	01-07	Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО+	313,550	-	-	313,550
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	313,550			313,550
10	01-08	Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58+	55,882	-	-	55,882
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	55,882			55,882
11	01-09	Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз		-	-	4,289
		в тому числі:	784,595			784,595
		виконані роботи	780,306	20,233		800,539
		залишки робіт	4,289	0,000		4,289
12	Розрахунок N П-12	Відновлення траси дороги на місцевості I кат. складності	-	-	13,130	13,130
13	01-09	Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землевпорядної документації, отримання вихідних даних	0,000	0,000	2529,967	2529,967

1	2	3	4	5	6	7
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	0,000 0,000	0,000 0,000	2394,3 135,667	2394,300 135,667
		Разом за главою 1:	39963,512	20,233	2543,097	42526,842
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	10065,016 29898,496	20,233 0,000	2394,300 148,797	12479,549 30047,293
		Глава 2. Земляне полотно				
14	02-01	Земляне полотно	17834,177	-	-	17834,177
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	6237,058 11597,119			6237,058 11597,119
15	02-02	Земляне полотно /відновлювальні роботи/	427,680	-	-	427,680
		Разом за главою 2:	18261,857	-	-	18261,857
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	6237,058 12024,799			6237,058 12024,799
		Глава 3. Транспортні споруди				
16	03-01	Штучні споруди	13956,886	-	-	13956,886
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	12457,902 1498,984			12457,902 1498,984
17	03-02	Штучні споруди /відновлювальні робота/	1052,773	-	-	1052,773
		Разом за главою 3:	15009,659	-	-	15009,659
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	12457,902 2551,757			12457,902 2551,757
		Глава 4. Дорожній одяг				
18	04-01	Дорожній одяг	173249,077	-	-	173249,077
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	9368,312 163880,765			9368,312 163880,765

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою 4:	173249,077	-	-	173249,077
		в тому числі:				
		виконані роботи	9368,312			9368,312
		залишки робіт	163880,765			163880,765
		Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб				
19	05-01	Будівлі та споруди транспортної служби	4046,185	-	-	4046,185
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	4046,185			4046,185
		Разом за главою 5:	4046,185	-	-	4046,185
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	4046,185			4046,185
		Глава 6. Пересічення та примикання				
20	06-01	Пересічення та примикання	4059,536	-	-	4059,536
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	4059,536			4059,536
21	06-02	Кільцева розв'язка+	38019,023	-	-	38019,023
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	38019,023			38019,023
		Разом за главою 6:	42078,559	-	-	42078,559
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	42078,559			42078,559
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
22	07-01	Облаштування та обстановка дороги+	14946,702	-	-	14946,702
		в тому числі:				
		виконані роботи	8250,000			8250,000
		залишки робіт	6696,702			6696,702
23	07-02	Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення	2120,866	-	-	2120,866
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	2120,866			2120,866

1	2	3	4	5	6	7
24	07-03	Том 6.1 Автономне електроосвітлення+	232,261	66,513	-	298,774
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000	0,000		0,000
		залишки робіт	232,261	66,513		298,774
		Разом за главою 7:	17299,829	66,513	-	17366,342
		в тому числі:				
		виконані роботи	8250,000	0,000		8250,000
		залишки робіт	9049,829	66,513		9116,342
		Разом за главами 1-7:	309908,678	86,746	2543,097	312538,521
		в тому числі:				
		виконані роботи	46378,288	20,233	2394,300	48792,821
		залишки робіт	263530,390	66,513	148,797	263745,700
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
25		Тимчасові будівлі і споруди	241,592	0,000	0,000	241,592
		в тому числі:				
		виконані роботи	241,592	0,000	0,000	241,592
		залишки робіт	0,000	0,000	0,000	0,000
		Разом за главами 1-8:	310150,270	86,746	2543,097	312780,113
		в тому числі:				
		виконані роботи	46619,880	20,233	2394,300	49034,413
		залишки робіт	263530,390	66,513	148,797	263745,700
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
26	Методика [4.21]	Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	1607,535	-	-	1607,535
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	1607,535			1607,535
27	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	10793,290	10793,290
		в тому числі:				
		виконані роботи			447,75033	447,750
		залишки робіт			10345,540	10345,540
28	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	1122,571	1122,571
		в тому числі:				
		виконані роботи			134,88015	134,880
		залишки робіт			987,691	987,691

1	2	3	4	5	6	7
		Кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних підрозділів	-	-	118,000	118,000
		в тому числі:				
		виконані роботи			118,000	118,000
		залишки робіт			0,000	0,000
		Разом за главою 9:	1607,535	0,000	12033,861	13641,396
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000	0,000	700,630	700,630
		залишки робіт	1607,535	0,000	11333,231	12940,766
		Разом за главами 1-9:	311757,805	86,746	14576,958	326421,510
		в тому числі:				
		виконані роботи	46619,880	20,233	3094,930	49735,044
		залишки робіт	265137,925	66,513	11482,028	276686,466
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
29	Методика [4.27]	Кошти на утримання служби замовника (1,5 %)	-	-	5353,159	5353,159
		в тому числі:				
		виконані роботи			1202,86153	1202,862
		залишки робіт			4150,297	4150,297
30	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4150,297	4150,297
		в тому числі:				
		виконані роботи			0,000	0,000
		залишки робіт			4150,297	4150,297
31	Методика [4.27]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	5533,729	5533,729
		в тому числі:				
		виконані роботи			0,000	0,000
		залишки робіт			5533,729	5533,729
32	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	159,083	159,083
		в тому числі:				
		виконані роботи			0,000	0,000
		залишки робіт			159,083	159,083
33	Розрахунок N П-108	Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	-	-	15,746	15,746
		в тому числі:				
		виконані роботи			0,000	0,000
		залишки робіт			15,746	15,746
34	Розрахунок	Вартість контрольного геодезичного знімання /залишки робіт/	-	-	182,827	182,827
		Разом за главою 10:	-	-	15394,841	15394,841


1	2	3	4	5	6	7
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт			1202,862 14191,979	1202,862 14191,979
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
31	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	183,565	183,565
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт			0,000 183,565	0,000 183,565
32	Додаток 11 до Методики [48]	Вартість проектних робіт	-	-	3805,078	3805,078
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт			2976,528 828,550	2976,528 828,550
33	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	403,023	403,023
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт			223,472 179,551	223,472 179,551
34	Додаток 11 до Методики [50]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	587,734	587,734
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт			25,25417 562,480	25,254 562,480
		Разом за главою 12:	-	-	4979,400	4979,400
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт			3225,254 1754,146	3225,254 1754,146
		Разом за главами 1-12:	311757,805	86,746	34951,199	346795,750
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	46619,880 265137,925	20,233 66,513	7523,046 27428,153	54163,159 292632,591
	Методика [4.31]	Кошторисний прибуток (П)	37487,656	-	-	37487,656
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	1551,776 35935,880			1551,776 35935,880
	Методика [4.34]	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)	-	-	12393,982	12393,982
		в тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Методика [4.35, 4.36]	виконані роботи залишки робіт Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (P)	13256,896	3,326	415,35461 11978,627 1371,408	415,355 11978,627 14631,630
	Розрахунок N П-145	в тому числі: виконані роботи залишки робіт Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	0,000 13256,896 21676,616	0,000 3,326 6,811	0,000 1371,408 -	0,000 14631,630 21683,427
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт Разом	0,000 21676,616 384178,973	0,000 6,811 96,883	0,000 7938,401 48716,589	0,000 21683,427 432992,445
		Податок на додану вартість	48171,656 336007,317 -	20,233 76,650 -	7938,401 40778,188 85235,908	56130,290 376862,155 85235,908
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт Всього за зведеним кошторисним розрахунком	48171,656 336007,317 384178,973	20,233 76,650 96,883	9866,62576 75369,282 133952,497	9866,626 75369,282 518228,353
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт Зворотні суми зокрема:	48171,656 336007,317 -	20,233 76,650 -	17805,027 116147,470 -	65996,916 452231,437 283,717
		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	283,717
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	-	0,000 283,717

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторис склала

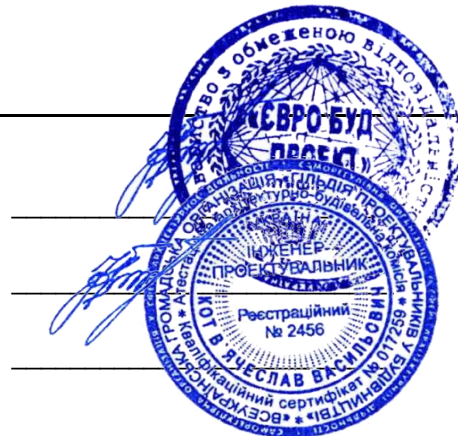

В'ячеслав Кот

В'ячеслав Кот

Ольга Стулій
