

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав



Стецюк О.В.

Перевіряв



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 85847,918 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 139,88275 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 24700,476 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на підготовчі роботи	26646,083	-	26646,083	41,64003	7368,799	-
2	01-02-02	на додаткові роботи по видаленню зелених насаджень	2914,626	-	2914,626	11,18911	1778,535	-
3	01-02-03	на підготовчі роботи (додатково)	56287,209	-	56287,209	87,05361	15553,142	-
-	-	Всього:	85847,918	-	85847,918	139,88275	24700,476	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склав

Перевірив




Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	підготовчі роботи	<u>0.82928</u> 101,295	<u>-</u> -	<u>5.64412</u> 1077,895	<u>30.70520</u> 5142,932	<u>-</u> -	<u>37.17860</u> 6322,122	<u>4.46143</u> 1046,677	<u>41.64003</u> 7368,799
01-02-02	додаткові роботи по видаленню зелених насаджень	<u>8.54352</u> 1226,548	<u>-</u> -	<u>1.42607</u> 267,178	<u>0.02070</u> 3,466	<u>-</u> -	<u>9.99029</u> 1497,192	<u>1.19882</u> 281,343	<u>11.18911</u> 1778,535
01-02-03	підготовчі роботи (додатково)	<u>0.38122</u> 46,566	<u>-</u> -	<u>17.21837</u> 3240,607	<u>60.02597</u> 10053,891	<u>-</u> -	<u>77.62556</u> 13341,064	<u>9.42805</u> 2212,078	<u>87.05361</u> 15553,142
-	Разом :	<u>9.75402</u> 1374,409	<u>-</u> -	<u>24.28856</u> 4585,68	<u>90.75187</u> 15200,289	<u>-</u> -	<u>124.79445</u> 21160,378	<u>15.08830</u> 3540,098	<u>139.88275</u> 24700,476

Склав

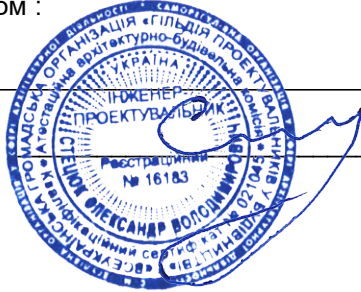

Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	232568,932 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	231,48077 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35942,174 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	7087,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_**	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	159693,844	-	159693,844	148,30737	22965,478	22,533
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	159693,844	-	159693,844	148,30737	22965,478	22,533
2	02-01-02	Ліфти на монтаж ліфтів	917,92	-	917,92	4,08753	641,411	0,130
3	02-01-03	на придбання устаткування придбання ліфтового обладнання	-	5293,214	5293,214	-	-	0,747
4	02-01-04	на пусконаладжувальні роботи	779,882	-	779,882	3,00012	617,294	0,110
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	1697,802	5293,214	6991,016	7,08765	1258,705	0,987
5	02-01-05	Внутрішні мережі на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	1868,302	-	1868,302	2,05659	324,244	0,264
6	02-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації	-	252,126	252,126	-	-	0,036
7	02-01-07	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	461,341	29,439	490,78	0,71181	110,021	0,069
8	02-01-08	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	7012,845	-	7012,845	6,83482	1058,807	0,990

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-01-09	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	1116,618	1116,618	-	-	0,158
10	02-01-010	на Монтаж системи блискавкозахисту	422,881	-	422,881	1,21030	173,231	0,060
11	02-01-011	на Опалення та вентиляція	19120,203	-	19120,203	28,80581	4400,285	2,698
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	10970,583	10970,583	-	-	1,548
--								
-		- Разом по розділу: Пожежна безпека та оповіщення	--	-	-	-	-	-
			28885,572	12368,766	41254,338	39,61933	6066,588	5,823
13	02-01-013	на Монтаж системи пожежної сигналізації	2153,629	-	2153,629	7,69074	1160,56	0,304
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	2039,429	2039,429	-	-	0,288
15	02-01-015	на Налагодження системи пожежної сигналізації	236,202	-	236,202	0,90865	186,959	0,033
16	02-01-016	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	1270,281	-	1270,281	4,11028	618,738	0,179
17	02-01-017	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	134,417	134,417	-	-	0,019
18	02-01-018	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	12,467	-	12,467	0,04796	9,868	0,002
19	02-01-019	на Монтаж системи газового пожежогасіння	669,301	-	669,301	1,51911	231,459	0,094
20	02-01-020	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння	-	782,743	782,743	-	-	0,110
21	02-01-021	на Налагодження системи газового пожежогасіння	61,035	-	61,035	0,23479	48,31	0,009
22	02-01-022	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	1538,773	-	1538,773	5,86108	865,513	0,217
23	02-01-023	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	1705,567	1705,567	-	-	0,241
24	02-01-024	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	83,921	-	83,921	0,32284	66,426	0,012
25	02-01-025	на Монтаж системи контролю загазованості повітря	522,307	-	522,307	2,49807	375,828	0,074
26	02-01-026	на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря	-	42,385	42,385	-	-	0,006
27	02-01-028_С3	на Монтаж систем зв'язку	2454,782	-	2454,782	6,77216	1054,274	0,346
28	02-01-029	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	1343,736	1343,736	-	-	0,190
29	02-01-030_С3	на Налагодження систем зв'язку	110,766	-	110,766	0,42610	87,674	0,016


1	2	3	4	5	6	7	8	9
--		--	--	--	--	--	--	--
-		Разом по розділу:	9113,464	6048,277	15161,741	30,39178	4705,609	2,140
		<u>Охоронна сигналізація та відеоспостереження</u>						
30	02-01-031	на Монтаж системи охоронної сигналізації	217,071	-	217,071	0,92733	140,138	0,031
31	02-01-032	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	64,108	64,108	-	-	0,009
32	02-01-033	на Налагодження системи охоронної сигналізації	47,363	-	47,363	0,18221	37,49	0,007
33	02-01-034	на Монтаж системи відеоспостереження	314,116	-	314,116	0,93269	150,502	0,044
34	02-01-035	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	663,177	663,177	-	-	0,094
--		--	--	--	--	--	--	--
-		Разом по розділу:	578,55	727,285	1305,835	2,04223	328,13	0,185
		<u>Система контролю доступу</u>						
35	02-01-036	на Монтаж системи контролю доступу	1200,253	-	1200,253	3,81936	573,827	0,169
36	02-01-037	на придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю доступу	-	558,503	558,503	-	-	0,079
37	02-01-038	на Налагодження системи контролю доступу	55,383	-	55,383	0,21305	43,837	0,008
--		--	--	--	--	--	--	--
-		Разом по розділу:	1255,636	558,503	1814,139	4,03241	617,664	0,256
		<u>Меблі та обладнання</u>						
38	02-01-039	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Адміністративна будівля)	41,109	6306,91	6348,019	-	-	0,896
--		--	--	--	--	--	--	--
-		Разом по розділу:	41,109	6306,91	6348,019	-	-	0,896
--		--	--	--	--	--	--	--
-		Всього:	201265,977	31302,955	232568,932	231,48077	35942,174	32,820

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



[підпис, (ініціала прізвище)]

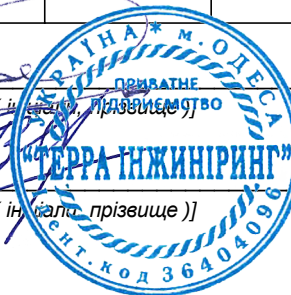


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.

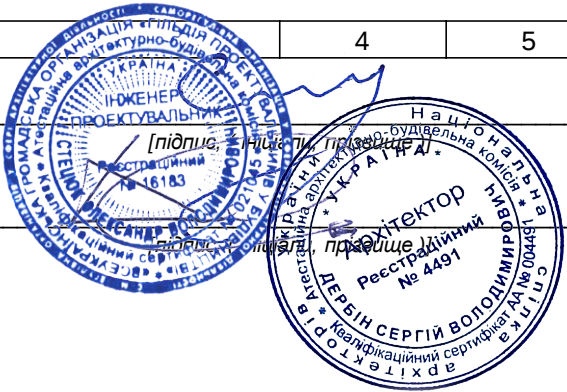

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_**	Будівельні роботи Загальнобудівельні роботи	<u>122.84081</u> 17616,655	<u>-</u> -	<u>8.23005</u> 1396,006	<u>1.37301</u> 229,949	<u>-</u> -	<u>132.44387</u> 19242,61	<u>15.86350</u> 3722,868	<u>148.30737</u> 22965,478
-	Разом по розділу:	<u>122.84081</u> 17616,655	<u>-</u> -	<u>8.23005</u> 1396,006	<u>1.37301</u> 229,949	<u>-</u> -	<u>132.44387</u> 19242,61	<u>15.86350</u> 3722,868	<u>148.30737</u> 22965,478
02-01-02	Ліфти монтаж ліфтів	<u>-</u> -	<u>3.30580</u> 489,06	<u>0.48246</u> 82,119	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.78826</u> 571,179	<u>0.29927</u> 70,232	<u>4.08753</u> 641,411
02-01-03	придбання устаткування придбання ліфтового обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-04	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.76000</u> 560,942	<u>2.76000</u> 560,942	<u>0.24012</u> 56,352	<u>3.00012</u> 617,294
-	Разом по розділу:	<u>-</u> -	<u>3.30580</u> 489,06	<u>0.48246</u> 82,119	<u>-</u> -	<u>2.76000</u> 560,942	<u>6.54826</u> 1132,121	<u>0.53939</u> 126,584	<u>7.08765</u> 1258,705
02-01-05	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>1.73580</u> 260,395	<u>-</u> -	<u>0.13305</u> 19,788	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.86885</u> 280,183	<u>0.18774</u> 44,061	<u>2.05659</u> 324,244
02-01-06	придбання устаткування Придбання устаткування для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-07	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0.44445</u> 67,57	<u>0.17280</u> 22,679	<u>0.02916</u> 4,425	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.64641</u> 94,674	<u>0.06540</u> 15,347	<u>0.71181</u> 110,021

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-021	Налагодження системи газового пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.21600</u> 43,9	<u>0.21600</u> 43,9	<u>0.01879</u> 4,41	<u>0.23479</u> 48,31
02-01-022	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>0.05550</u> 7,375	<u>5.33558</u> 747,932	<u>0.00093</u> 0,125	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.39201</u> 755,432	<u>0.46907</u> 110,081	<u>5.86108</u> 865,513
02-01-023	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-024	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.29700</u> 60,362	<u>0.29700</u> 60,362	<u>0.02584</u> 6,064	<u>0.32284</u> 66,426
02-01-025	Монтаж системи контролю загазованості повітря	<u>-</u> -	<u>2.29544</u> 328,275	<u>0.00002</u> 0,003	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.29546</u> 328,278	<u>0.20261</u> 47,55	<u>2.49807</u> 375,828
02-01-026	придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-028_С3	Монтаж систем зв'язку	<u>-</u> -	<u>6.20188</u> 920,529	<u>0.00096</u> 0,143	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.20284</u> 920,672	<u>0.56932</u> 133,602	<u>6.77216</u> 1054,274
02-01-029	придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-030_С3	Налагодження систем зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.39200</u> 79,67	<u>0.39200</u> 79,67	<u>0.03410</u> 8,004	<u>0.42610</u> 87,674
-	Разом по розділу:	<u>0.23307</u> 30,855	<u>25.83437</u> 3718,984	<u>0.03887</u> 6,173	<u>-</u> -	<u>1.78504</u> 362,791	<u>27.89135</u> 4118,803	<u>2.50043</u> 586,806	<u>30.39178</u> 4705,609
	<u>Охоронна сигналізація та відеоспостереження</u>								
02-01-031	Монтаж системи охоронної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0.85274</u> 122,642	<u>0.00006</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.85280</u> 122,651	<u>0.07453</u> 17,487	<u>0.92733</u> 140,138
02-01-032	придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-033	Налагодження системи охоронної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16762</u> 34,068	<u>0.16762</u> 34,068	<u>0.01459</u> 3,422	<u>0.18221</u> 37,49
02-01-034	Монтаж системи відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>0.85770</u> 132,902	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.85770</u> 132,902	<u>0.07499</u> 17,6	<u>0.93269</u> 150,502

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-035	придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом по розділу:	- -	<u>1.71044</u> 255,544	<u>0.00006</u> 0,009	- -	<u>0.16762</u> 34,068	<u>1.87812</u> 289,621	<u>0.16411</u> 38,509	<u>2.04223</u> 328,13
	Система контролю доступу								
02-01-036	Монтаж системи контролю доступу	- -	<u>3.41384</u> 486,073	<u>0.09134</u> 14,022	- -	- -	<u>3.50518</u> 500,095	<u>0.31418</u> 73,732	<u>3.81936</u> 573,827
02-01-037	придбання устаткування Придбання обладнання системи контролю доступу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-038	Налагодження системи контролю доступу	- -	- -	- -	- -	<u>0.19600</u> 39,835	<u>0.19600</u> 39,835	<u>0.01705</u> 4,002	<u>0.21305</u> 43,837
-	Разом по розділу:	- -	<u>3.41384</u> 486,073	<u>0.09134</u> 14,022	- -	<u>0.19600</u> 39,835	<u>3.70118</u> 539,93	<u>0.33123</u> 77,734	<u>4.03241</u> 617,664
	Меблі та обладнання								
02-01-039	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Адміністративна будівля)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом по розділу:	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом	<u>147.58793</u> 21166,347	<u>44.43585</u> 6457,823	<u>10.23861</u> 1707,608	<u>1.37301</u> 229,949	<u>4.98866</u> 749,836	<u>208.54406</u> 30559,363	<u>22.93671</u> 5382,811	<u>231.48077</u> 35942,174

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	62239,616 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	47,97375 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7478,877 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл
Будівельні обсяги	1300,630 м2 з.пл

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01_**	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	52655,896	-	52655,896	37,37625	5848,363	40,485
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	52655,896	-	52655,896	37,37625	5848,363	40,485
2	02-02-02	Внутрішні мережі на внутрішні мережі водопостачання та каналізації	149,998	-	149,998	0,13485	21,448	0,115
3	02-02-03	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	206,602	-	206,602	0,38731	62,22	0,159
4	02-02-04	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	1579,259	-	1579,259	2,48005	376,168	1,214
5	02-02-05	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	27,077	27,077	-	-	0,021
6	02-02-06	на Опалення та вентиляція	2433,613	-	2433,613	4,05483	621,097	1,871
7	02-02-07	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	3486,168	3486,168	-	-	2,680
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	4369,472	3513,245	7882,717	7,05704	1080,933	6,060
8	02-02-08	Пожежна безпека та оповіщення на Монтаж системи пожежної сигналізації	113,691	-	113,691	0,43094	64,778	0,087

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-02-09	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	141,414	141,414	-	-	0,109
10	02-02-010	на Налагодження системи пожежної сигналізації	18,742	-	18,742	0,07210	14,836	0,014
11	02-02-011	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	162,271	-	162,271	0,58545	87,987	0,125
12	02-02-012	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	23,395	23,395	-	-	0,018
13	02-02-013	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	2,972	-	2,972	0,01144	2,353	0,002
14	02-02-014	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	515,544	-	515,544	1,65916	251,134	0,396
15	02-02-015	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	118,38	118,38	-	-	0,091
16	02-02-016	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	14,537	-	14,537	0,05591	11,505	0,011
--								
-		- Разом по розділу: Системи зв'язку	-- 827,757	- 283,189	- 1110,946	- 2,81500	- 432,593	- 0,853
17	02-02-017_С3	на Монтаж систем зв'язку	58,855	-	58,855	0,19994	31,702	0,045
18	02-02-018	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	54,079	54,079	-	-	0,042
19	02-02-019_С3	на Налагодження систем зв'язку	2,3	-	2,3	0,00885	1,82	0,002
--								
-		- Разом по розділу: Охоронна сигналізація та відеоспостереження	-- 61,155	- 54,079	- 115,234	- 0,20879	- 33,522	- 0,089
20	02-02-020	на Монтаж системи охоронної сигналізації	83,238	-	83,238	0,36121	53,952	0,064
21	02-02-021	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	47,58	47,58	-	-	0,037
22	02-02-022	на Налагодження системи охоронної сигналізації	27,692	-	27,692	0,10653	21,919	0,021
23	02-02-023	на Монтаж системи відеоспостереження	14,496	-	14,496	0,04893	7,595	0,011
24	02-02-024	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	47,551	47,551	-	-	0,037
--								
-		- Разом по розділу: Меблі та обладнання	-- 125,426	- 95,131	- 220,557	- 0,51667	- 83,466	- 0,170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	02-02-025	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)	1,744	252,522	254,266	-	-	0,195
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	1,744	252,522	254,266	-	-	0,195
-	-	Всього:	58041,45	4198,166	62239,616	47,97375	7478,877	47,852

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив



Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01_**	Будівельні роботи								
	Загальнобудівельні роботи	<u>31.68529</u> 4615,457	<u>-</u> -	<u>1.68610</u> 293,058	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>33.37139</u> 4908,515	<u>4.00486</u> 939,848	<u>37.37625</u> 5848,363
-	Разом по розділу:	<u>31.68529</u> 4615,457	<u>-</u> -	<u>1.68610</u> 293,058	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>33.37139</u> 4908,515	<u>4.00486</u> 939,848	<u>37.37625</u> 5848,363
02-02-02	Внутрішні мережі								
	внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.11261</u> 17,065	<u>-</u> -	<u>0.00959</u> 1,414	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12220</u> 18,479	<u>0.01265</u> 2,969	<u>0.13485</u> 21,448
02-02-03	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0.28018</u> 42,632	<u>0.04640</u> 7,182	<u>0.02423</u> 3,838	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.35081</u> 53,652	<u>0.03650</u> 8,568	<u>0.38731</u> 62,22
02-02-04	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>1.67355</u> 237,327	<u>0.58800</u> 87,562	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.26155</u> 324,889	<u>0.21850</u> 51,279	<u>2.48005</u> 376,168
02-02-05	придбання устаткування. Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-06	Опалення та вентиляція	<u>3.00318</u> 431,765	<u>0.40423</u> 62,094	<u>0.28834</u> 42,968	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.69575</u> 536,827	<u>0.35908</u> 84,27	<u>4.05483</u> 621,097
02-02-07	придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом по розділу:	<u>3.39597</u> 491,462	<u>2.12418</u> 306,603	<u>0.91016</u> 135,782	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.43031</u> 933,847	<u>0.62673</u> 147,086	<u>7.05704</u> 1080,933
	Пожежна безпека та оповіщення								

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-08	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0.39467</u> 56,28	<u>0.00016</u> 0,022	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.39483</u> 56,302	<u>0.03611</u> 8,476	<u>0.43094</u> 64,778
02-02-09	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-010	Налагодження системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06633</u> 13,481	<u>0.06633</u> 13,481	<u>0.00577</u> 1,355	<u>0.07210</u> 14,836
02-02-011	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>0.53948</u> 77,201	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.53950</u> 77,203	<u>0.04595</u> 10,784	<u>0.58545</u> 87,987
02-02-012	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-013	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01052</u> 2,138	<u>0.01052</u> 2,138	<u>0.00092</u> 0,215	<u>0.01144</u> 2,353
02-02-014	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>0.14430</u> 19,176	<u>1.37067</u> 198,129	<u>0.00013</u> 0,018	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.51510</u> 217,323	<u>0.14406</u> 33,811	<u>1.65916</u> 251,134
02-02-015	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-016	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05144</u> 10,455	<u>0.05144</u> 10,455	<u>0.00447</u> 1,05	<u>0.05591</u> 11,505
-	Разом по розділу:	<u>0.14430</u> 19,176	<u>2.30482</u> 331,61	<u>0.00031</u> 0,042	<u>-</u> -	<u>0.12829</u> 26,074	<u>2.57772</u> 376,902	<u>0.23728</u> 55,691	<u>2.81500</u> 432,593
	Системи зв'язку								
02-02-017_С 3	Монтаж систем зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.18346</u> 27,886	<u>0.00067</u> 0,101	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18413</u> 27,987	<u>0.01581</u> 3,715	<u>0.19994</u> 31,702
02-02-018	придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-019_С 3	Налагодження систем зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00814</u> 1,654	<u>0.00814</u> 1,654	<u>0.00071</u> 0,166	<u>0.00885</u> 1,82

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом по розділу:	-	<u>0.18346</u>	<u>0.00067</u>	-	<u>0.00814</u>	<u>0.19227</u>	<u>0.01652</u>	<u>0.20879</u>
		-	27,886	0,101	-	1,654	29,641	3,881	33,522
	Охоронна сигналізація та відеоспостереження								
02-02-020	Монтаж системи охоронної сигналізації	-	<u>0.33308</u>	<u>0.00002</u>	-	-	<u>0.33310</u>	<u>0.02811</u>	<u>0.36121</u>
		-	47,352	0,003	-	-	47,355	6,597	53,952
02-02-021	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-022	Налагодження системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	<u>0.09800</u>	<u>0.09800</u>	<u>0.00853</u>	<u>0.10653</u>
		-	-	-	-	19,918	19,918	2,001	21,919
02-02-023	Монтаж системи відеоспостереження	-	<u>0.04478</u>	-	-	-	<u>0.04478</u>	<u>0.00415</u>	<u>0.04893</u>
		-	6,619	-	-	-	6,619	0,976	7,595
02-02-024	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	-	<u>0.37786</u>	<u>0.00002</u>	-	<u>0.09800</u>	<u>0.47588</u>	<u>0.04079</u>	<u>0.51667</u>
		-	53,971	0,003	-	19,918	73,892	9,574	83,466
	Меблі та обладнання								
02-02-025	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>35.22556</u>	<u>4.99032</u>	<u>2.59726</u>	-	<u>0.23443</u>	<u>43.04757</u>	<u>4.92618</u>	<u>47.97375</u>
		5126,095	720,07	428,986	-	46,046	6322,797	1156,08	7478,877

Склад



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	14525,263 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,03262 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1890,525 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01_***	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи - з уточненими обсягами по фасадах	10509,713	-	10509,713	8,08265	1274,119	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	10509,713	-	10509,713	8,08265	1274,119	-
2	02-03-02	Внутрішні мережі на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	125,524	-	125,524	0,09168	14,582	-
3	02-03-03	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	476,576	-	476,576	0,72727	111,006	-
4	02-03-04	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	21,192	21,192	-	-	-
5	02-03-05	на Опалення та вентиляція	865,345	-	865,345	1,56495	239,18	-
6	02-03-06	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	1384,882	1384,882	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	1467,445	1406,074	2873,519	2,38390	364,768	-
7	02-03-07	Пожежна безпека та оповіщення на Монтаж системи пожежної сигналізації	80,605	-	80,605	0,24883	37,661	-
8	02-03-08	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	75,775	75,775	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-03-09	на Налагодження системи пожежної сигналізації	27,692	-	27,692	0,10653	21,919	-
10	02-03-010	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	143,209	-	143,209	0,49031	73,974	-
11	02-03-011	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	20,223	20,223	-	-	-
12	02-03-012	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	2,972	-	2,972	0,01144	2,353	-
--								
-		- Разом по розділу: Системи зв'язку	-- 254,478	- 95,998	- 350,476	- 0,85711	- 135,907	- -
13	02-03-013_С3	на Монтаж систем зв'язку	68,203	-	68,203	0,25604	41,171	-
14	02-03-014	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	64,707	64,707	-	-	-
15	02-03-015_С3	на Налагодження систем зв'язку	2,3	-	2,3	0,00885	1,82	-
--								
-		- Разом по розділу: Охоронна сигналізація та відеоспостереження	-- 70,503	- 64,707	- 135,21	- 0,26489	- 42,991	- -
16	02-03-016	на Монтаж системи охоронної сигналізації	59,433	-	59,433	0,26596	39,578	-
17	02-03-017	на придбання устаткування Придбання обладнання системи охоронної сигналізації	-	42,353	42,353	-	-	-
18	02-03-018	на Налагодження системи охоронної сигналізації	27,692	-	27,692	0,10653	21,919	-
19	02-03-019	на Монтаж системи відеоспостереження	20,342	-	20,342	0,07158	11,243	-
20	02-03-020	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	95,102	95,102	-	-	-
--								
-		- Разом по розділу: Меблі та обладнання	-- 107,467	- 137,455	- 244,922	- 0,44407	- 72,74	- -
21	02-03-021	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)	2,67	408,753	411,423	-	-	-
--								
-		- Разом по розділу:	-- 2,67	- 408,753	- 411,423	- -	- -	- -
--								
-		Всього:	12412,276	2112,987	14525,263	12,03262	1890,525	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01_***	Будівельні роботи Загальнобудівельні роботи - з уточненими обсягами по фасадах	<u>7.04020</u> 1042,697	<u>-</u> -	<u>0.17645</u> 28,19	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.21665</u> 1070,887	<u>0.86600</u> 203,232	<u>8.08265</u> 1274,119
-	Разом по розділу:	<u>7.04020</u> 1042,697	<u>-</u> -	<u>0.17645</u> 28,19	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.21665</u> 1070,887	<u>0.86600</u> 203,232	<u>8.08265</u> 1274,119
02-03-02	Внутрішні мережі Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.07741</u> 11,718	<u>-</u> -	<u>0.00563</u> 0,835	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08304</u> 12,553	<u>0.00864</u> 2,029	<u>0.09168</u> 14,582
02-03-03	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>0.64277</u> 92,706	<u>0.02060</u> 3,3	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.66337</u> 96,006	<u>0.06390</u> 15	<u>0.72727</u> 111,006
02-03-04	придбання устаткування. Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-03-05	Опалення та вентиляція	<u>1.19238</u> 171,432	<u>0.16940</u> 25,808	<u>0.06605</u> 9,754	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.42783</u> 206,994	<u>0.13712</u> 32,186	<u>1.56495</u> 239,18
02-03-06	придбання устаткування. придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом по розділу:	<u>1.26979</u> 183,15	<u>0.81217</u> 118,514	<u>0.09228</u> 13,889	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.17424</u> 315,553	<u>0.20966</u> 49,215	<u>2.38390</u> 364,768
02-03-07	Пожежна безпека та оповіщення Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>0.01876</u> 2,463	<u>0.20626</u> 29,723	<u>0.00228</u> 0,422	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22730</u> 32,608	<u>0.02153</u> 5,053	<u>0.24883</u> 37,661

[illegible]


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-018	Налагодження системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	0.09800	0.09800	0.00853	0.10653
02-03-019	Монтаж системи відеоспостереження	-	0.06558	-	-	19,918	19,918	2,001	21,919
02-03-020	придбання устаткування	-	9,838	-	-	-	0.06558	0.00600	0.07158
	Придбання обладнання системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	9,838	1,405	11,243
-	Разом по розділу:	-	0.31066	0.00002	-	0.09800	0.40868	0.03539	0.44407
	Меблі та обладнання	-	44,515	0,003	-	19,918	64,436	8,304	72,74
02-03-021	придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	8.34207	2.00218	0.27110	-	0.21466	10.83001	1.20261	12.03262
		1230,08	292,065	42,514	-	48,828	1608,287	282,238	1890,525

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	40181,937 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	44,84942 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6930,822 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2 з.пл
Будівельні обсяги	872,640 м2 з.пл

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	Будівельні роботи на загальнобудівельні роботи	29748,375	-	29748,375	32,76262	5071,948	34,090
--		--	--	--	--	--	--	--
-		- Разом по розділу:	29748,375	-	29748,375	32,76262	5071,948	34,090
2	02-04-03	Внутрішні мережі на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	609,174	-	609,174	0,67377	107,081	0,698
3	02-04-05	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	185,825	-	185,825	0,20616	33,254	0,213
4	02-04-06	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	1067,112	-	1067,112	1,46178	225,162	1,223
5	02-04-07	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	27,195	27,195	-	-	0,031
6	02-04-08	на Монтаж системи блискавкозахисту	278,227	-	278,227	0,82257	117,449	0,319
7	02-04-09	на Вентиляція та кондиціонування	3242,936	-	3242,936	5,20183	796,036	3,716
8	02-04-011	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	2006,046	2006,046	-	-	2,299
--		--	--	--	--	--	--	--
-		- Разом по розділу:	5383,274	2033,241	7416,515	8,36611	1278,982	8,499
9	02-04-012	Пожежна безпека та оповіщення на Монтаж системи пожежної сигналізації	431,415	-	431,415	1,31908	200,42	0,494

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-04-013	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	158,42	158,42	-	-	0,182
11	02-04-014	на Налагодження системи пожежної сигналізації	27,692	-	27,692	0,10653	21,919	0,032
12	02-04-015	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	114,904	-	114,904	0,41025	61,578	0,132
13	02-04-016	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	20,887	20,887	-	-	0,024
14	02-04-017	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	26,719	-	26,719	0,10279	21,149	0,031
15	02-04-018	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	407,492	-	407,492	1,37821	208,044	0,467
16	02-04-019	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	117,221	117,221	-	-	0,134
17	02-04-020	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	11,778	-	11,778	0,04531	9,322	0,013
--								
-		- Разом по розділу: Системи зв'язку	-- 1020	- 296,528	- 1316,528	- 3,36217	- 522,432	- 1,509
18	02-04-021_С3	на Монтаж систем зв'язку	93,438	-	93,438	0,34082	53,819	0,107
19	02-04-022	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	86,259	86,259	-	-	0,099
20	02-04-023_С3	на Налагодження систем зв'язку	4,6	-	4,6	0,01770	3,641	0,005
--								
-		- Разом по розділу: Меблі та обладнання	-- 98,038	- 86,259	- 184,297	- 0,35852	- 57,46	- 0,211
21	02-04-024	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Господарська будівля)	7,886	1508,336	1516,222	-	-	1,738
--								
-		- Разом по розділу:	-- 7,886	- 1508,336	- 1516,222	- -	- -	- 1,738
--								
-		Всього:	36257,573	3924,364	40181,937	44,84942	6930,822	46,047

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив




 [підпис, ініціали, прізвище]]
 [підпис, ініціали, прізвище]]
 [підпис, ініціали, прізвище]]
 [підпис, ініціали, прізвище]]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Будівельні роботи загальнобудівельні роботи	<u>28.70974</u> 4167,617	<u>-</u> -	<u>0.59355</u> 92,495	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>29.30329</u> 4260,112	<u>3.45933</u> 811,836	<u>32.76262</u> 5071,948
-	Разом по розділу:	<u>28.70974</u> 4167,617	<u>-</u> -	<u>0.59355</u> 92,495	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>29.30329</u> 4260,112	<u>3.45933</u> 811,836	<u>32.76262</u> 5071,948
02-04-03	Внутрішні мережі Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.55642</u> 84,295	<u>-</u> -	<u>0.05394</u> 7,907	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.61036</u> 92,202	<u>0.06341</u> 14,879	<u>0.67377</u> 107,081
02-04-05	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0.11519</u> 17,544	<u>0.05760</u> 8,904	<u>0.01451</u> 2,377	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18730</u> 28,825	<u>0.01886</u> 4,429	<u>0.20616</u> 33,254
02-04-06	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>1.24347</u> 180,809	<u>0.08906</u> 14,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.33253</u> 194,829	<u>0.12925</u> 30,333	<u>1.46178</u> 225,162
02-04-07	придбання устаткування. Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-08	Монтаж системи блискавкозахисту	<u>0.52546</u> 66,711	<u>0.21456</u> 31,375	<u>0.00011</u> 0,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.74013</u> 98,103	<u>0.08244</u> 19,346	<u>0.82257</u> 117,449
02-04-09	Вентиляція та кондиціонування	<u>4.08610</u> 588,761	<u>0.41480</u> 62,795	<u>0.22943</u> 33,84	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.73033</u> 685,396	<u>0.47150</u> 110,64	<u>5.20183</u> 796,036
02-04-011	придбання устаткування. придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом по розділу:	<u>5.28317</u> 757,311	<u>1.93043</u> 283,883	<u>0.38705</u> 58,161	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.60065</u> 1099,355	<u>0.76546</u> 179,627	<u>8.36611</u> 1278,982

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-023_С3	Налагодження систем зв'язку	-	-	-	-	0.01628 3,309	0.01628 3,309	0.00142 0,332	0.01770 3,641
-	Разом по розділу:	-	0.31327 47,359	0.00006 0,01	-	0.01628 3,309	0.32961 50,678	0.02891 6,782	0.35852 57,46
02-04-024	Меблі та обладнання придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Господарська будівля)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	34.23344 4956,675	4.82777 703,918	0.99683 153,672	-	0.25052 50,916	40.30856 5865,181	4.54086 1065,641	44.84942 6930,822

Склад



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 6213,276 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 5,62903 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 876,306 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	Будівельні роботи на загальнобудівельні роботи	5004,243	-	5004,243	4,41220	688,259	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	5004,243	-	5004,243	4,41220	688,259	-
2	02-05-02	Внутрішні мережі на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	476,874	-	476,874	0,35692	56,715	-
3	02-05-03	на придбання устаткування придбання обладнання простору	0,837	256,795	257,632	-	-	-
4	02-05-04	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	226,147	-	226,147	0,53057	80,433	-
5	02-05-05	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	11,538	11,538	-	-	-
6	02-05-06	на Опалення та вентиляція	236,842	-	236,842	0,32934	50,899	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	940,7	268,333	1209,033	1,21683	188,047	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	5944,943	268,333	6213,276	5,62903	876,306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив



Стецюк О.В.


Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	Будівельні роботи загальнобудівельні роботи	<u>3.83179</u> 561,416	<u>-</u> -	<u>0.12363</u> 19,663	<u>0.00033</u> 0,055	<u>-</u> -	<u>3.95575</u> 581,134	<u>0.45645</u> 107,125	<u>4.41220</u> 688,259
-	Разом по розділу:	<u>3.83179</u> 561,416	<u>-</u> -	<u>0.12363</u> 19,663	<u>0.00033</u> 0,055	<u>-</u> -	<u>3.95575</u> 581,134	<u>0.45645</u> 107,125	<u>4.41220</u> 688,259
02-05-02	Внутрішні мережі Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.29271</u> 44,396	<u>0.00914</u> 1,274	<u>0.02159</u> 3,186	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32344</u> 48,856	<u>0.03348</u> 7,859	<u>0.35692</u> 56,715
02-05-03	придбання устаткування придбання обладнання простору	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-04	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>0.36829</u> 52,363	<u>0.11588</u> 17,184	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.48417</u> 69,547	<u>0.04640</u> 10,886	<u>0.53057</u> 80,433
02-05-05	придбання устаткування. Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-06	Опалення та вентиляція	<u>0.26371</u> 38,512	<u>0.00320</u> 0,485	<u>0.03199</u> 4,756	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.29890</u> 43,753	<u>0.03044</u> 7,146	<u>0.32934</u> 50,899
-	Разом по розділу:	<u>0.55642</u> 82,908	<u>0.38063</u> 54,122	<u>0.16946</u> 25,126	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.10651</u> 162,156	<u>0.11032</u> 25,891	<u>1.21683</u> 188,047
-	Разом :	<u>4.38821</u> 644,324	<u>0.38063</u> 54,122	<u>0.29309</u> 44,789	<u>0.00033</u> 0,055	<u>-</u> -	<u>5.06226</u> 743,29	<u>0.56677</u> 133,016	<u>5.62903</u> 876,306

1		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	--	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Колумбарна стіна №2. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив




Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 30059,759 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,74388 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 808,444 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-07-01	на колумбарні стіні № 1	14687,002	-	14687,002	2,09866	362,045	-
2	02-07-02	на колумбарні стіні № 3	383,093	-	383,093	0,30379	46,839	-
3	02-07-03	на колумбарна стіна № 4	14989,664	-	14989,664	2,34143	399,56	-
-	-	Всього:	30059,759	-	30059,759	4,74388	808,444	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив



Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-07-01	колумбарні стіні № 1	<u>1.86196</u> 307,432	<u>-</u> -	<u>0.01184</u> 1,843	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.87380</u> 309,275	<u>0.22486</u> 52,77	<u>2.09866</u> 362,045
02-07-02	колумбарні стіні № 3	<u>0.22474</u> 31,233	<u>-</u> -	<u>0.02886</u> 5,011	<u>0.01764</u> 2,955	<u>-</u> -	<u>0.27124</u> 39,199	<u>0.03255</u> 7,64	<u>0.30379</u> 46,839
02-07-03	колумбарна стіна № 4	<u>2.03767</u> 331,78	<u>-</u> -	<u>0.03525</u> 5,95	<u>0.01764</u> 2,955	<u>-</u> -	<u>2.09056</u> 340,685	<u>0.25087</u> 58,875	<u>2.34143</u> 399,56
-	Разом :	<u>4.12437</u> 670,445	<u>-</u> -	<u>0.07595</u> 12,804	<u>0.03528</u> 5,91	<u>-</u> -	<u>4.23560</u> 689,159	<u>0.50828</u> 119,285	<u>4.74388</u> 808,444

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : Меморіал. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 3482,787 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 10,97115 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1749,858 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-08-01	на Меморіал	3482,787	-	3482,787	10,97115	1749,858	-
-	-	Всього:	3482,787	-	3482,787	10,97115	1749,858	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

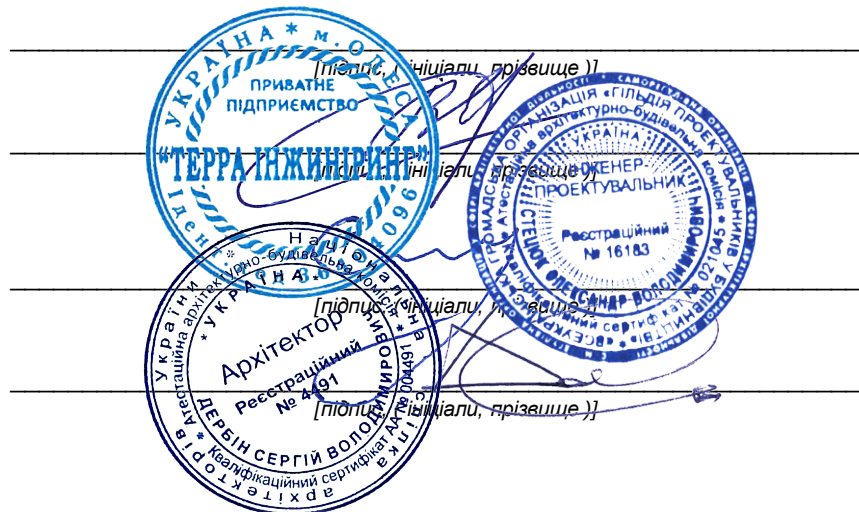

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-08-01	Меморіал	<u>9.36475</u> 1400,925	<u>-</u> -	<u>0.43114</u> 73,126	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.79589</u> 1474,051	<u>1.17526</u> 275,807	<u>10.97115</u> 1749,858
-	Разом :	<u>9.36475</u> 1400,925	<u>-</u> -	<u>0.43114</u> 73,126	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.79589</u> 1474,051	<u>1.17526</u> 275,807	<u>10.97115</u> 1749,858

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-09

на будівництво : Монумент. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 151,098 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,12914 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 19,903 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-09-01	на Монументи	151,098	-	151,098	0,12914	19,903	-
-	-	Всього:	151,098	-	151,098	0,12914	19,903	-


Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-09-01	Монументи	<u>0.09497</u> 13,194	<u>-</u> -	<u>0.01408</u> 2,416	<u>0.00626</u> 1,048	<u>-</u> -	<u>0.11531</u> 16,658	<u>0.01383</u> 3,245	<u>0.12914</u> 19,903
-	Разом :	<u>0.09497</u> 13,194	<u>-</u> -	<u>0.01408</u> 2,416	<u>0.00626</u> 1,048	<u>-</u> -	<u>0.11531</u> 16,658	<u>0.01383</u> 3,245	<u>0.12914</u> 19,903

Скла



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Ангар. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 7482,874 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,10383 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 949,593 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		<u>Будівельні роботи</u>						
1	03-01-01	на загальнобудівельні роботи	5868,434	-	5868,434	3,41651	534,034	-
2	03-01-03	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	90,249	-	90,249	0,12279	19,282	-
3	03-01-04	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	17,778	17,778	-	-	-
4	03-01-05	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	980,325	-	980,325	1,59025	241,878	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		- Разом по розділу:	--	-	-	-	-	-
		<u>Пожежна безпека та оповіщення</u>						
5	03-01-06	на Монтаж системи пожежної сигналізації	78,59	-	78,59	0,26229	40,276	-
6	03-01-07	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	70,053	70,053	-	-	-
7	03-01-08	на Налагодження системи пожежної сигналізації	9,89	-	9,89	0,03805	7,829	-
8	03-01-09	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	85,065	-	85,065	0,20179	31,15	-
9	03-01-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,173	16,173	-	-	-
10	03-01-011	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	5,369	-	5,369	0,02066	4,25	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	03-01-012	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	97,258	-	97,258	0,28194	43,272	-
12	03-01-013	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	59,19	59,19	-	-	-
13	03-01-014	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	6,782	-	6,782	0,02609	5,369	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу: Системи зв'язку	282,954	145,416	428,37	0,83082	132,146	-
14	03-01-015_С3	на Монтаж систем зв'язку	45,619	-	45,619	0,13150	19,792	-
15	03-01-016	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	48,991	48,991	-	-	-
16	03-01-017_С3	на Налагодження систем зв'язку	3,108	-	3,108	0,01196	2,461	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	48,727	48,991	97,718	0,14346	22,253	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	7270,689	212,185	7482,874	6,10383	949,593	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірив



Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Будівельні роботи								
03-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>2.84859</u> 413,144	<u>0.01680</u> 2,622	<u>0.18569</u> 32,506	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.05108</u> 448,272	<u>0.36543</u> 85,762	<u>3.41651</u> 534,034
03-01-03	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0.07967</u> 12,129	<u>0.02680</u> 3,734	<u>0.00508</u> 0,779	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11155</u> 16,642	<u>0.01124</u> 2,64	<u>0.12279</u> 19,282
03-01-04	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
03-01-05	Придбання устаткування. Електротехнічні рішення. Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>1.09838</u> 156,751	<u>0.35152</u> 52,19	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.44990</u> 208,941	<u>0.14035</u> 32,937	<u>1.59025</u> 241,878
-	Разом по розділу:	<u>2.92826</u> 425,273	<u>1.14198</u> 163,107	<u>0.54229</u> 85,475	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.61253</u> 673,855	<u>0.51702</u> 121,339	<u>5.12955</u> 795,194
	Пожежна безпека та оповіщення								
03-01-06	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0.23933</u> 34,924	<u>0.00034</u> 0,045	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23967</u> 34,969	<u>0.02262</u> 5,307	<u>0.26229</u> 40,276
03-01-07	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
03-01-08	Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03500</u> 7,114	<u>0.03500</u> 7,114	<u>0.00305</u> 0,715	<u>0.03805</u> 7,829
03-01-09	Налагодження системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18435</u> 27,056	<u>0.01744</u> 4,094	<u>0.20179</u> 31,15
03-01-09	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>0.18361</u> 26,934	<u>0.00074</u> 0,122	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18435</u> 27,056	<u>0.01744</u> 4,094	<u>0.20179</u> 31,15

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-010	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
03-01-011	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01900</u> 3,862	<u>0.01900</u> 3,862	<u>0.00166</u> 0,388	<u>0.02066</u> 4,25
03-01-012	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>0.25723</u> 37,497	<u>0.00026</u> 0,036	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25749</u> 37,533	<u>0.02445</u> 5,739	<u>0.28194</u> 43,272
03-01-013	придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
03-01-014	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02400</u> 4,878	<u>0.02400</u> 4,878	<u>0.00209</u> 0,491	<u>0.02609</u> 5,369
-	Разом по розділу:	<u>-</u> -	<u>0.68017</u> 99,355	<u>0.00134</u> 0,203	<u>-</u> -	<u>0.07800</u> 15,854	<u>0.75951</u> 115,412	<u>0.07131</u> 16,734	<u>0.83082</u> 132,146
	Системи зв'язку								
03-01-015_С3	Монтаж систем зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.12010</u> 17,122	<u>0.00006</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12016</u> 17,131	<u>0.01134</u> 2,661	<u>0.13150</u> 19,792
03-01-016	придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
03-01-017_С3	Налагодження систем зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01100</u> 2,236	<u>0.01100</u> 2,236	<u>0.00096</u> 0,225	<u>0.01196</u> 2,461
-	Разом по розділу:	<u>-</u> -	<u>0.12010</u> 17,122	<u>0.00006</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>0.01100</u> 2,236	<u>0.13116</u> 19,367	<u>0.01230</u> 2,886	<u>0.14346</u> 22,253
-	Разом :	<u>2.92826</u> 425,273	<u>1.94225</u> 279,584	<u>0.54369</u> 85,687	<u>-</u> -	<u>0.08900</u> 18,09	<u>5.50320</u> 808,634	<u>0.60063</u> 140,959	<u>6.10383</u> 949,593

1		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	--	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	5774,126 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,25003 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1117,874 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	42,370 м2

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-02-01	Будівельні роботи на загальнобудівельні роботи	4905,831	-	4905,831	5,85075	905,12	115,785
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	4905,831	-	4905,831	5,85075	905,12	115,785
2	03-02-02	Внутрішні мережі на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	71,128	-	71,128	0,05845	9,245	1,679
3	03-02-03	на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	298,256	-	298,256	0,82173	122,203	7,039
4	03-02-04	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	27,077	27,077	-	-	0,639
5	03-02-05	на Опалення та вентиляція	129,412	-	129,412	0,21597	33,162	3,054
6	03-02-06	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціювання	-	59,888	59,888	-	-	1,413
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	498,796	86,965	585,761	1,09615	164,61	13,824
7	03-02-07	Пожежна безпека та оповіщення на Монтаж системи пожежної сигналізації	32,985	-	32,985	0,12886	19,096	0,778
8	03-02-08	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	35,558	35,558	-	-	0,839
9	03-02-09	на Налагодження системи пожежної сигналізації	5,369	-	5,369	0,02066	4,25	0,127

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	03-02-010	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	29,027	-	29,027	0,06465	10,03	0,685
11	03-02-011	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	4,865	4,865	-	-	0,115
12	03-02-012	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	3,108	-	3,108	0,01196	2,461	0,073
--								
-		- Разом по розділу: Системи зв'язку	-- 70,489	- 40,423	- 110,912	- 0,22613	- 35,837	- 2,617
13	03-02-013_С3	на Монтаж систем зв'язку	26,239	-	26,239	0,06504	9,846	0,619
14	03-02-014	на придбання устаткування Придбання обладнання систем зв'язку	-	44,458	44,458	-	-	1,049
15	03-02-015_С3	на Налагодження систем зв'язку	3,108	-	3,108	0,01196	2,461	0,073
--								
-		- Разом по розділу: Меблі та обладнання	-- 29,347	- 44,458	- 73,805	- 0,07700	- 12,307	- 1,741
16	03-02-016	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони)	0,617	97,2	97,817	-	-	2,309
--								
-		- Разом по розділу:	-- 0,617	- 97,2	- 97,817	- -	- -	- 2,309
--								
-		Всього:	5505,08	269,046	5774,126	7,25003	1117,874	136,276

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-02-01	Будівельні роботи загальнобудівельні роботи	<u>5.16166</u> 749,181	<u>-</u> -	<u>0.07707</u> 12,316	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.23873</u> 761,497	<u>0.61202</u> 143,623	<u>5.85075</u> 905,12
-	Разом по розділу:	<u>5.16166</u> 749,181	<u>-</u> -	<u>0.07707</u> 12,316	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.23873</u> 761,497	<u>0.61202</u> 143,623	<u>5.85075</u> 905,12
03-02-02	Внутрішні мережі Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.04897</u> 7,362	<u>-</u> -	<u>0.00400</u> 0,594	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05297</u> 7,956	<u>0.00548</u> 1,289	<u>0.05845</u> 9,245
03-02-03	Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>0.70968</u> 99,074	<u>0.03957</u> 6,124	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.74925</u> 105,198	<u>0.07248</u> 17,005	<u>0.82173</u> 122,203
03-02-04	придбання устаткування. Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
03-02-05	Опалення та вентиляція	<u>0.16708</u> 24,194	<u>0.01536</u> 2,326	<u>0.01415</u> 2,095	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19659</u> 28,615	<u>0.01938</u> 4,547	<u>0.21597</u> 33,162
03-02-06	придбання устаткування. придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом по розділу:	<u>0.21605</u> 31,556	<u>0.72504</u> 101,4	<u>0.05772</u> 8,813	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.99881</u> 141,769	<u>0.09734</u> 22,841	<u>1.09615</u> 164,61
03-02-07	Пожежна безпека та оповіщення Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0.11331</u> 15,816	<u>0.00455</u> 0,7	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11786</u> 16,516	<u>0.01100</u> 2,58	<u>0.12886</u> 19,096

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом по розділу:	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>5.37771</u> 780,737	<u>0.95497</u> 134,138	<u>0.14116</u> 22,143	<u>-</u> -	<u>0.04100</u> 8,334	<u>6.51484</u> 945,352	<u>0.73519</u> 172,522	<u>7.25003</u> 1117,874

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	2669,316 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,13077 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	341,000 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища	1015,115	-	1015,115	2,13077	341	-
2	04-01-02	на придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання	-	1654,201	1654,201	-	-	-
-	-	Всього:	1015,115	1654,201	2669,316	2,13077	341	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища	<u>0.40918</u> 53,135	<u>1.23792</u> 191,024	<u>0.27890</u> 50,568	<u>0.02654</u> 4,445	- -	<u>1.95254</u> 299,172	<u>0.17823</u> 41,828	<u>2.13077</u> 341
04-01-02	придбання устаткування Устаткування резервного електропостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>0.40918</u> 53,135	<u>1.23792</u> 191,024	<u>0.27890</u> 50,568	<u>0.02654</u> 4,445	- -	<u>1.95254</u> 299,172	<u>0.17823</u> 41,828	<u>2.13077</u> 341

Склад



Стецюк О.В.

Перевіряє



Дербін С.В.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	2933,6	-	2933,6	2,93920	450,864	-
--		--	--	--	--	--	--	--
-		- Разом по розділу:	2933,6	-	2933,6	2,93920	450,864	-
2	04-02-02	Електромонтажні роботи на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	531,624	-	531,624	1,67779	265,63	-
3	04-02-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	-	3856,835	3856,835	-	-	-
4	04-02-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	37,298	-	37,298	0,14348	29,525	-
--		--	--	--	--	--	--	--
-		- Разом по розділу:	568,922	3856,835	4425,757	1,82127	295,155	-
5	04-02-05	Телемеханізація на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	45,608	-	45,608	0,15343	24,143	-
6	04-02-06	на монтажні та будівельні роботи по ПС	26,793	-	26,793	0,08887	14,317	-
7	04-02-07	на придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	-	104,279	104,279	-	-	-
8	04-02-08	на пусконаладжувальні роботи	11,868	-	11,868	0,04565	9,395	-
--		--	--	--	--	--	--	--
-		-	--	-	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом по розділу: Пожежна безпека	84,269	104,279	188,548	0,28795	47,855	-
9	04-02-09	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	1026,397	-	1026,397	3,81818	556,994	-
10	04-02-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння ТП-1	-	1127,859	1127,859	-	-	-
11	04-02-011	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	22,04	-	22,04	0,08478	17,446	-
--								
-		Разом по розділу:	1048,437	1127,859	2176,296	3,90296	574,44	-
--								
-		Всього:	4635,228	5088,973	9724,201	8,95138	1368,314	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склав

Перевірив



Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Будівельні роботи Загальнобудівельні роботи	<u>2.46152</u> 349,781	<u>-</u> -	<u>0.16085</u> 26,724	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.62237</u> 376,505	<u>0.31683</u> 74,359	<u>2.93920</u> 450,864
-	Разом по розділу:	<u>2.46152</u> 349,781	<u>-</u> -	<u>0.16085</u> 26,724	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.62237</u> 376,505	<u>0.31683</u> 74,359	<u>2.93920</u> 450,864
04-02-02	Електромонтажні роботи монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	<u>0.08404</u> 10,294	<u>1.30734</u> 196,594	<u>0.13631</u> 23,511	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.52769</u> 230,399	<u>0.15010</u> 35,231	<u>1.67779</u> 265,63
04-02-03	придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-02-04	пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13200</u> 26,828	<u>0.13200</u> 26,828	<u>0.01148</u> 2,697	<u>0.14348</u> 29,525
-	Разом по розділу:	<u>0.08404</u> 10,294	<u>1.30734</u> 196,594	<u>0.13631</u> 23,511	<u>-</u> -	<u>0.13200</u> 26,828	<u>1.65969</u> 257,227	<u>0.16158</u> 37,928	<u>1.82127</u> 295,155
04-02-05	Телемеханізація монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ	<u>0.00455</u> 0,65	<u>0.13571</u> 20,418	<u>0.00029</u> 0,051	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14055</u> 21,119	<u>0.01288</u> 3,024	<u>0.15343</u> 24,143
04-02-06	монтажні та будівельні роботи по ПС	<u>-</u> -	<u>0.08109</u> 12,493	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08109</u> 12,493	<u>0.00778</u> 1,824	<u>0.08887</u> 14,317
04-02-07	придбання устаткування придбання устаткування телемеханіки	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-02-08	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04200</u> 8,537	<u>0.04200</u> 8,537	<u>0.00365</u> 0,858	<u>0.04565</u> 9,395

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом по розділу:	<u>0.00455</u> 0,65	<u>0.21680</u> 32,911	<u>0.00029</u> 0,051	<u>-</u> -	<u>0.04200</u> 8,537	<u>0.26364</u> 42,149	<u>0.02431</u> 5,706	<u>0.28795</u> 47,855
	Пожежна безпека								
04-02-09	Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-1	<u>1.60062</u> 204,047	<u>1.80132</u> 259,75	<u>0.05431</u> 8,261	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.45625</u> 472,058	<u>0.36193</u> 84,936	<u>3.81818</u> 556,994
04-02-010	придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння ТП-1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-02-011	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07800</u> 15,853	<u>0.07800</u> 15,853	<u>0.00678</u> 1,593	<u>0.08478</u> 17,446
-	Разом по розділу:	<u>1.60062</u> 204,047	<u>1.80132</u> 259,75	<u>0.05431</u> 8,261	<u>-</u> -	<u>0.07800</u> 15,853	<u>3.53425</u> 487,911	<u>0.36871</u> 86,529	<u>3.90296</u> 574,44
-	Разом :	<u>4.15073</u> 564,772	<u>3.32546</u> 489,255	<u>0.35176</u> 58,547	<u>-</u> -	<u>0.25200</u> 51,218	<u>8.07995</u> 1163,792	<u>0.87143</u> 204,522	<u>8.95138</u> 1368,314

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 8141,310 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,91235 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1216,465 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-03-01	Будівельні роботи на загальнобудівельні роботи	2901,256	-	2901,256	2,05662	327,527	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	2901,256	-	2901,256	2,05662	327,527	-
2	04-03-02	Електромонтажні роботи на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	467,099	-	467,099	1,47191	233,098	-
3	04-03-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2	-	2417,76	2417,76	-	-	-
4	04-03-04	на пусконаладжувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	41,82	-	41,82	0,16087	33,104	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	508,919	2417,76	2926,679	1,63278	266,202	-
5	04-03-05	Пожежна безпека на Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2	1149,966	-	1149,966	4,13817	605,29	-
6	04-03-06	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2	-	1141,369	1141,369	-	-	-
7	04-03-07	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2	22,04	-	22,04	0,08478	17,446	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	1172,006	1141,369	2313,375	4,22295	622,736	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	4582,181	3559,129	8141,31	7,91235	1216,465	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	Будівельні роботи загальнобудівельні роботи	<u>1.73134</u> 257,767	<u>-</u> -	<u>0.11212</u> 19,735	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.84346</u> 277,502	<u>0.21316</u> 50,025	<u>2.05662</u> 327,527
-	Разом по розділу:	<u>1.73134</u> 257,767	<u>-</u> -	<u>0.11212</u> 19,735	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.84346</u> 277,502	<u>0.21316</u> 50,025	<u>2.05662</u> 327,527
04-03-02	Електромонтажні роботи монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	<u>0.06131</u> 7,418	<u>1.16402</u> 175,205	<u>0.11515</u> 19,627	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.34048</u> 202,25	<u>0.13143</u> 30,848	<u>1.47191</u> 233,098
04-03-03	придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-03-04	пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14800</u> 30,08	<u>0.14800</u> 30,08	<u>0.01287</u> 3,024	<u>0.16087</u> 33,104
-	Разом по розділу:	<u>0.06131</u> 7,418	<u>1.16402</u> 175,205	<u>0.11515</u> 19,627	<u>-</u> -	<u>0.14800</u> 30,08	<u>1.48848</u> 232,33	<u>0.14430</u> 33,872	<u>1.63278</u> 266,202
04-03-05	Пожежна безпека Монтаж системи порошкового пожежогасіння ТП-2	<u>1.60062</u> 204,047	<u>2.10168</u> 303,013	<u>0.04875</u> 7,384	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.75105</u> 514,444	<u>0.38712</u> 90,846	<u>4.13817</u> 605,29
04-03-06	придбання устаткування Придбання обладнання системи газового пожежогасіння ТП-2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-03-07	Налагодження системи порошкового пожежогасіння ТП-2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07800</u> 15,853	<u>0.07800</u> 15,853	<u>0.00678</u> 1,593	<u>0.08478</u> 17,446

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом по розділу:	<u>1.60062</u> 204,047	<u>2.10168</u> 303,013	<u>0.04875</u> 7,384	<u>-</u> -	<u>0.07800</u> 15,853	<u>3.82905</u> 530,297	<u>0.39390</u> 92,439	<u>4.22295</u> 622,736
-	Разом :	<u>3.39327</u> 469,232	<u>3.26570</u> 478,218	<u>0.27602</u> 46,746	<u>-</u> -	<u>0.22600</u> 45,933	<u>7.16099</u> 1040,129	<u>0.75136</u> 176,336	<u>7.91235</u> 1216,465

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Електропостачання. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив



Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-05

на будівництво : Електропостачання. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 25805,717 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 18,94488 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2966,077 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-05-01	на будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ	102,373	-	102,373	0,10260	15,961	-
2	04-05-02	на будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ	17607,923	-	17607,923	6,99946	1079,422	-
3	04-05-03	на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ	8095,421	-	8095,421	11,84282	1870,694	-
-	-	Всього:	25805,717	-	25805,717	18,94488	2966,077	-


Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-05-01	будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ	<u>0.04610</u> 6,661	<u>0.02765</u> 3,897	<u>0.01956</u> 3,223	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09331</u> 13,781	<u>0.00929</u> 2,18	<u>0.10260</u> 15,961
04-05-02	будівельно-монтажні роботи КЛ-10 кВ	<u>1.10322</u> 151,788	<u>4.50485</u> 651,14	<u>0.66783</u> 111,904	<u>0.07766</u> 13,007	<u>-</u> -	<u>6.35356</u> 927,839	<u>0.64590</u> 151,583	<u>6.99946</u> 1079,422
04-05-03	будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ	<u>2.63646</u> 327,929	<u>4.51750</u> 668,818	<u>3.13371</u> 538,108	<u>0.43336</u> 72,585	<u>-</u> -	<u>10.72103</u> 1607,44	<u>1.12179</u> 263,254	<u>11.84282</u> 1870,694
-	Разом :	<u>3.78578</u> 486,378	<u>9.05000</u> 1323,855	<u>3.82110</u> 653,235	<u>0.51102</u> 85,592	<u>-</u> -	<u>17.16790</u> 2549,06	<u>1.77698</u> 417,017	<u>18.94488</u> 2966,077

Склав



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-06-01	заміна трансформаторів струму на шинах 10 кВ ПС 35/10 кВ "Глеваха"	-	<u>0.01613</u> 2,443	<u>0.00045</u> 0,088	-	-	<u>0.01658</u> 2,531	<u>0.00161</u> 0,378	<u>0.01819</u> 2,909
04-06-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	-	<u>0.01613</u> 2,443	<u>0.00045</u> 0,088	-	-	<u>0.01658</u> 2,531	<u>0.00161</u> 0,378	<u>0.01819</u> 2,909

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-07

на будівництво : Реконструкція ПС 110/10 кВ "Іскра". 2 пусковий комплекс


Кошторисна вартість об'єкта 1025,687 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,50396 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 86,139 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-07-01	на електротехнічні рішення	64,34	-	64,34	0,23179	38,262	-
2	04-07-02	на придбання устаткування	-	613,712	613,712	-	-	-
3	04-07-03	на конструктивно-будівельні рішення	323,222	-	323,222	0,17826	28,553	-
4	04-07-04	на пусконаладжувальні роботи	24,413	-	24,413	0,09391	19,324	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	411,975	613,712	1025,687	0,50396	86,139	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-07-01	електротехнічні рішення	-	0.18498	0.02632	-	-	0.21130	0.02049	0.23179
		-	28,495	4,958	-	-	33,453	4,809	38,262
04-07-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
04-07-03	конструктивно-будівельні рішення	0.10811	-	0.04605	0.00500	-	0.15916	0.01910	0.17826
		15,206	-	8,029	0,837	-	24,072	4,481	28,553
04-07-04	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0.08640	0.08640	0.00751	0.09391
		-	-	-	-	17,559	17,559	1,765	19,324
-	Разом :	0.10811	0.18498	0.07237	0.00500	0.08640	0.45686	0.04710	0.50396
		15,206	28,495	12,987	0,837	17,559	75,084	11,055	86,139

Склав



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-08

на будівництво : Зовнішнє електропостачання Винесення та перобладнання ділянки ЛЕП-10кВ Л-ТП-1590 від ПС 110/35/27,5/10кВ "Боярка" за межі зони влаштування автомобільної дороги Замовника Консоціум "БІЛДІНГ ЮА" за адресою: Київська область, Фастівський р-н, Гатненська сільська рада, кад. №3222481200:05:002:0457, №3222481200:05:002:0458 (1 пусковий)

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив



Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	3487,055 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31396 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	208,156 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	50,490 м2

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	2872,696	-	2872,696	1,04611	167,045	56,896
--		--	--	--	--	--	--	--
-		- Разом по розділу:	2872,696	-	2872,696	1,04611	167,045	56,896
2	05-01-02	Внутрішні мережі на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	368,242	-	368,242	0,26785	41,111	7,293
3	05-01-03	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	246,117	246,117	-	-	4,875
--		--	--	--	--	--	--	--
-		- Разом по розділу:	368,242	246,117	614,359	0,26785	41,111	12,168
--		--	--	--	--	--	--	--
-		Всього:	3240,938	246,117	3487,055	1,31396	208,156	69,064


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив

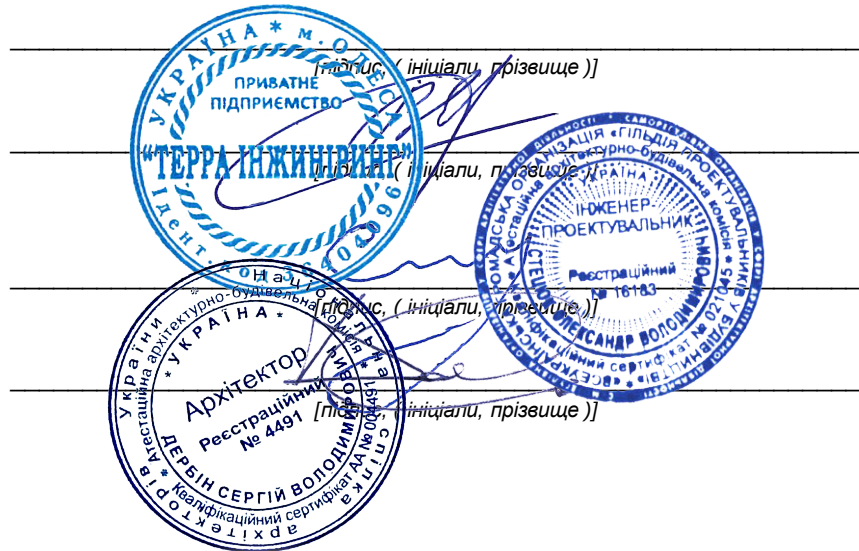

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Будівельні роботи Загальнобудівельні роботи	<u>0.87335</u> 130,642	<u>-</u> -	<u>0.05753</u> 9,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.93088</u> 140,002	<u>0.11523</u> 27,043	<u>1.04611</u> 167,045
-	Разом по розділу:	<u>0.87335</u> 130,642	<u>-</u> -	<u>0.05753</u> 9,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.93088</u> 140,002	<u>0.11523</u> 27,043	<u>1.04611</u> 167,045
05-01-02	Внутрішні мережі Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.	<u>0.05834</u> 7,749	<u>0.17439</u> 25,997	<u>0.01149</u> 1,819	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24422</u> 35,565	<u>0.02363</u> 5,546	<u>0.26785</u> 41,111
05-01-03	придбання устаткування. Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом по розділу:	<u>0.05834</u> 7,749	<u>0.17439</u> 25,997	<u>0.01149</u> 1,819	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24422</u> 35,565	<u>0.02363</u> 5,546	<u>0.26785</u> 41,111
-	Разом :	<u>0.93169</u> 138,391	<u>0.17439</u> 25,997	<u>0.06902</u> 11,179	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.17510</u> 175,567	<u>0.13886</u> 32,589	<u>1.31396</u> 208,156

Склад



Стецюк О.В.

Перевіряю



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Автомобільна дорога. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта - тис.грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірів





Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склад



Стецюк О.В.

Перевіряє



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-03

на будівництво : Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 56975,802 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 40,69595 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6728,805 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-03-01	на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс	38135,195	133,892	38269,087	21,22887	3322,27	-
2	05-03-02	на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс	1438,956	-	1438,956	0,70166	113,898	-
3	05-03-03	на додаткові роботи 2 пуковий комплекс	-	-	-	-	-	-
4	05-03-04	на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи №2)	17267,759	-	17267,759	18,76542	3292,637	-
-	-	Всього:	56841,91	133,892	56975,802	40,69595	6728,805	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	49,858	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-03-01	автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс	<u>11.07462</u> 1431,915	<u>0.14400</u> 21,366	<u>2.68533</u> 482,85	<u>4.95358</u> 829,692	-	<u>18.85753</u> 2765,823	<u>2.37134</u> 556,447	<u>21.22887</u> 3322,27
05-03-02	організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс	<u>0.32578</u> 43,698	-	<u>0.29500</u> 51,216	-	-	<u>0.62078</u> 94,914	<u>0.08088</u> 18,984	<u>0.70166</u> 113,898
05-03-03	додаткові роботи 2 пуковий комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-
05-03-04	автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи №2)	<u>1.03735</u> 138,445	-	<u>2.41275</u> 453,817	<u>13.30203</u> 2227,966	-	<u>16.75213</u> 2820,228	<u>2.01329</u> 472,409	<u>18.76542</u> 3292,637
-	Разом :	<u>12.43775</u> 1614,058	<u>0.14400</u> 21,366	<u>5.39308</u> 987,883	<u>18.25561</u> 3057,658	-	<u>36.23044</u> 5680,965	<u>4.46551</u> 1047,84	<u>40.69595</u> 6728,805

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-04

на будівництво : Влаштування проїзду в господарській зоні. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	- тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	1945,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив



Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-05

на будівництво : Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	34154,078 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,36251 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1113,490 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	10710,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-05-01	на влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	14897,408	-	14897,408	0,70271	121,892	1,391
2	05-05-02	на Влаштування проїзду в господарській зоні, на автостоянках, до очисних споруд та в'їздів на кладовище (Тип А). Засипка зеленої зони раніше вибраним ґрунтом (непридатним для виконання у будівництві). Тимчасові проїзди. (Додаткові роботи)	18083,729	-	18083,729	5,11814	899,143	1,688
3	05-05-03	на Тимчасовий майданчик для складування	1172,941	-	1172,941	0,54166	92,455	0,110
-	-	Всього:	34154,078	-	34154,078	6,36251	1113,49	3,189

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



(підпис) (ініціали, прізвище)

(підпис) (ініціали, прізвище)



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-05-01	влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	<u>0.30931</u> 42,451	<u>-</u> -	<u>0.31146</u> 60,212	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.62077</u> 102,663	<u>0.08194</u> 19,229	<u>0.70271</u> 121,892
05-05-02	Влаштування проїзду в господарській зоні, на автостоянках, до очисних споруд та в'їздів на кладовище (Тип А). Засипка зеленої зони раніше вибраним ґрунтом (непридатним для виконання у будівництві). Тимчасові проїзди. (Додаткові роботи)	<u>1.18945</u> 151,73	<u>-</u> -	<u>2.22615</u> 423,668	<u>1.12835</u> 188,971	<u>-</u> -	<u>4.54395</u> 764,369	<u>0.57419</u> 134,774	<u>5.11814</u> 899,143
05-05-03	Тимчасовий майданчик для складування	<u>0.14274</u> 18,368	<u>-</u> -	<u>0.22719</u> 41,278	<u>0.11151</u> 18,675	<u>-</u> -	<u>0.48144</u> 78,321	<u>0.06022</u> 14,134	<u>0.54166</u> 92,455
-	Разом :	<u>1.64150</u> 212,549	<u>-</u> -	<u>2.76480</u> 525,158	<u>1.23986</u> 207,646	<u>-</u> -	<u>5.64616</u> 945,353	<u>0.71635</u> 168,137	<u>6.36251</u> 1113,49

Склад



Стецюк О.В.

Перевіряю



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-06

на будівництво : Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс


Кошторисна вартість об'єкта	866,772 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,11120 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	174,082 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-06-01	на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження	701,659	-	701,659	1,06337	164,241	-
2	05-06-02	на придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження	-	152,679	152,679	-	-	-
3	05-06-03	на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження	12,434	-	12,434	0,04783	9,841	-
-	-	Всього:	714,093	152,679	866,772	1,11120	174,082	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-06-01	Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження	<u>0.26960</u> 36,302	<u>0.67840</u> 102,58	<u>0.01986</u> 2,944	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.96786</u> 141,826	<u>0.09551</u> 22,415	<u>1.06337</u> 164,241
05-06-02	придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
05-06-03	Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04400</u> 8,943	<u>0.04400</u> 8,943	<u>0.00383</u> 0,898	<u>0.04783</u> 9,841
-	Разом :	<u>0.26960</u> 36,302	<u>0.67840</u> 102,58	<u>0.01986</u> 2,944	<u>-</u> -	<u>0.04400</u> 8,943	<u>1.01186</u> 150,769	<u>0.09934</u> 23,313	<u>1.11120</u> 174,082

Склад



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-07

на будівництво : Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	344,001 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,14774 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	170,309 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-07-01	на Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ	344,001	-	344,001	1,14774	170,309	-
-	-	Всього:	344,001	-	344,001	1,14774	170,309	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірів

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-07-01	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ	<u>0.59043</u> 78,162	<u>0.42560</u> 62,139	<u>0.01906</u> 3,571	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.03509</u> 143,872	<u>0.11265</u> 26,437	<u>1.14774</u> 170,309
-	Разом :	<u>0.59043</u> 78,162	<u>0.42560</u> 62,139	<u>0.01906</u> 3,571	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.03509</u> 143,872	<u>0.11265</u> 26,437	<u>1.14774</u> 170,309

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-08

на будівництво : Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	1511,199 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,73235 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	404,422 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-08-01	на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку	1511,199	-	1511,199	2,73235	404,422	-
-	-	Всього:	1511,199	-	1511,199	2,73235	404,422	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ підпис, (ініціали, прізвище)

_____ підпис, (ініціали, прізвище)

_____ підпис, (ініціали, прізвище)

_____ підпис, (ініціали, прізвище)

_____ підпис, (ініціали, прізвище)

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-08-01	Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку	<u>1.34849</u> 175,699	<u>0.93965</u> 135,844	<u>0.15060</u> 25,813	<u>0.02736</u> 4,582	<u>-</u> -	<u>2.46610</u> 341,938	<u>0.26625</u> 62,484	<u>2.73235</u> 404,422
-	Разом :	<u>1.34849</u> 175,699	<u>0.93965</u> 135,844	<u>0.15060</u> 25,813	<u>0.02736</u> 4,582	<u>-</u> -	<u>2.46610</u> 341,938	<u>0.26625</u> 62,484	<u>2.73235</u> 404,422

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-09

на будівництво : Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 4217,029 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,90029 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 585,839 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-09-01	на монтаж	1572,289	-	1572,289	3,90029	585,839	-
2	05-09-02	на придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря	0,046	2644,694	2644,74	-	-	-
-	-	Всього:	1572,335	2644,694	4217,029	3,90029	585,839	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-09


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-09-01	монтаж	<u>1.73435</u> 228,405	<u>1.39283</u> 203,913	<u>0.39102</u> 63,849	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.51820</u> 496,167	<u>0.38209</u> 89,672	<u>3.90029</u> 585,839
05-09-02	придбання устаткування придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>1.73435</u> 228,405	<u>1.39283</u> 203,913	<u>0.39102</u> 63,849	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.51820</u> 496,167	<u>0.38209</u> 89,672	<u>3.90029</u> 585,839

Склад



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Дощова каналізація. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ (підпис, (ініціали, прізвище))

_____ (підпис, (ініціали, прізвище))

_____ (підпис, (ініціали, прізвище))

_____ (підпис, (ініціали, прізвище))


Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 9774,054 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,58600 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 405,495 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	9774,054	-	9774,054	2,58600	405,495	-
-	-	Всього:	9774,054	-	9774,054	2,58600	405,495	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірив




Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	<u>1.76770</u> 244,317	<u>-</u> -	<u>0.57857</u> 104,922	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.34627</u> 349,239	<u>0.23973</u> 56,256	<u>2.58600</u> 405,495
-	Разом :	<u>1.76770</u> 244,317	<u>-</u> -	<u>0.57857</u> 104,922	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.34627</u> 349,239	<u>0.23973</u> 56,256	<u>2.58600</u> 405,495

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив



Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 42027,291 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 28,78282 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4456,615 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Водопровід господарський питний	5784,249	-	5784,249	5,29858	814,642	-
2	06-04-02	на Водопровід пожежний	10468,569	-	10468,569	6,54634	1009,662	-
3	06-04-03	на Водопровід на полив	9575,186	-	9575,186	6,02643	926,068	-
4	06-04-06	на Каналізація побутова	14069,236	-	14069,236	10,60758	1659,429	-
5	06-04-07	на придбання устаткування Устаткування	-	1879,803	1879,803	-	-	-
6	06-04-08	на Каналізація зливов	250,248	-	250,248	0,30389	46,814	-
-	-	Всього:	40147,488	1879,803	42027,291	28,78282	4456,615	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	159,648	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Водопровід господарський питний	<u>3.52872</u> 480,669	<u>-</u> -	<u>0.76805</u> 132,436	<u>0.49966</u> 83,681	<u>-</u> -	<u>4.79643</u> 696,786	<u>0.50215</u> 117,856	<u>5.29858</u> 814,642
06-04-02	Водопровід пожежний	<u>4.08589</u> 557,178	<u>-</u> -	<u>1.20468</u> 200,481	<u>0.63564</u> 106,453	<u>-</u> -	<u>5.92621</u> 864,112	<u>0.62013</u> 145,55	<u>6.54634</u> 1009,662
06-04-03	Водопровід на полив	<u>3.91609</u> 533,943	<u>-</u> -	<u>1.01580</u> 170,777	<u>0.52866</u> 88,537	<u>-</u> -	<u>5.46055</u> 793,257	<u>0.56588</u> 132,811	<u>6.02643</u> 926,068
06-04-06	Каналізація побутова	<u>5.05836</u> 677,288	<u>0.61990</u> 90,406	<u>2.90772</u> 481,874	<u>0.96100</u> 160,977	<u>-</u> -	<u>9.54698</u> 1410,545	<u>1.06060</u> 248,884	<u>10.60758</u> 1659,429
06-04-07	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-04-08	Устаткування	<u>0.27079</u> 39,429	<u>-</u> -	<u>0.00701</u> 1,261	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27780</u> 40,69	<u>0.02609</u> 6,124	<u>0.30389</u> 46,814
-	Разом :	<u>16.85985</u> 2288,507	<u>0.61990</u> 90,406	<u>5.90326</u> 986,829	<u>2.62496</u> 439,648	<u>-</u> -	<u>26.00797</u> 3805,39	<u>2.77485</u> 651,225	<u>28.78282</u> 4456,615

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

Кошторисна вартість об'єкта	3672,676 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,47845 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	396,161 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-05-01	на Свердловина -1	1856,716	-	1856,716	1,30248	208,526	-
2	06-05-02	на Свердловина -2	1815,96	-	1815,96	1,17597	187,635	-
--								
-		Всього:	3672,676	-	3672,676	2,47845	396,161	-

Перевірів

[підпис, (ініціали, різниця)]

Гідник, (ініціали, прізвище)

І підписавши, прізвище

Гітис, (ініціали, прізвище)

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	Свердловина -1	<u>0.80506</u> 115,315	<u>0.06830</u> 10,648	<u>0.30403</u> 53,209	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.17739</u> 179,172	<u>0.12509</u> 29,354	<u>1.30248</u> 208,526
06-05-02	Свердловина -2	<u>0.74887</u> 107,042	<u>0.06830</u> 10,648	<u>0.24583</u> 43,437	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.06300</u> 161,127	<u>0.11297</u> 26,508	<u>1.17597</u> 187,635
-	Разом :	<u>1.55393</u> 222,357	<u>0.13660</u> 21,296	<u>0.54986</u> 96,646	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.24039</u> 340,299	<u>0.23806</u> 55,862	<u>2.47845</u> 396,161

Склав



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06/*

на будівництво : Котельня. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта 23925,059 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 13,16639 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2115,429 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	10314,989	-	10314,989	6,20984	978,325	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу: Внутрішні мережі	10314,989	-	10314,989	6,20984	978,325	-
2	06-06-02	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	89,238	-	89,238	0,11293	17,504	-
3	06-06-03	на Монтаж системи блискавкозахисту	174,367	-	174,367	0,45247	64,894	-
4	06-06-04	на Налагодження системи блискавкозахисту	6,51	-	6,51	0,02504	5,154	-
5	06-06-05	на опалення та вентиляцію	160,086	-	160,086	0,13914	21,419	-
6	06-06-06	на водопровід та каналізація згідно креслення ТОМ 10.8 03 24-8-Р.ВК Котельня Водопостачання та каналізація	640,673	-	640,673	0,36297	57,544	-
7	06-06-07	на тепломеханічна частина	3927,766	-	3927,766	2,62654	408,599	-
8	06-06-09	на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини	0,877	5987,028	5987,905	-	-	-
9	06-06-010	на автоматизацію тепломеханічних рішень	290,458	-	290,458	0,47235	72,988	-
10	06-06-011	на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень	-	1051,657	1051,657	-	-	-
11	06-06-012	на електротехнічні рішення	400,453	-	400,453	0,60937	94,8	-
12	06-06-013	на газопостачання внутрішнє	111,241	-	111,241	0,09908	15,842	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	06-06-014	на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	-	60,483	60,483	-	-	-
14	06-06-015	на пуско-налагоджувальні роботи котельного обладнання та внутрішнього газопостачання	300,087	-	300,087	1,15439	237,524	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	6101,756	7099,168	13200,924	6,05428	996,268	-
-	-	Пожежна безпека та оповіщення	-	-	-	-	-	-
15	06-06-016	на Монтаж системи пожежної сигналізації	39,881	-	39,881	0,13433	20,591	-
16	06-06-017	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	44,084	44,084	-	-	-
17	06-06-018	на Налагодження системи пожежної сигналізації	5,428	-	5,428	0,02089	4,297	-
18	06-06-019	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	109,657	-	109,657	0,30265	46,354	-
19	06-06-020	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,173	16,173	-	-	-
20	06-06-021	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	2,972	-	2,972	0,01144	2,353	-
21	06-06-022	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	132,755	-	132,755	0,40905	62,321	-
22	06-06-023	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	51,981	51,981	-	-	-
23	06-06-024	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	6,215	-	6,215	0,02391	4,92	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	296,908	112,238	409,146	0,90227	140,836	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	16713,653	7211,406	23925,059	13,16639	2115,429	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Будівельні роботи Загальнобудівельні роботи	<u>5.27151</u> 778,017	<u>-</u> -	<u>0.27021</u> 44,219	<u>0.01062</u> 1,778	<u>-</u> -	<u>5.55234</u> 824,014	<u>0.65750</u> 154,311	<u>6.20984</u> 978,325
-	Разом по розділу:	<u>5.27151</u> 778,017	<u>-</u> -	<u>0.27021</u> 44,219	<u>0.01062</u> 1,778	<u>-</u> -	<u>5.55234</u> 824,014	<u>0.65750</u> 154,311	<u>6.20984</u> 978,325
	Внутрішні мережі								
06-06-02	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0.04506</u> 6,862	<u>0.05440</u> 7,81	<u>0.00399</u> 0,607	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10345</u> 15,279	<u>0.00948</u> 2,225	<u>0.11293</u> 17,504
06-06-03	Монтаж системи блискавкозахисту	<u>0.26273</u> 33,356	<u>0.14542</u> 21,147	<u>0.00011</u> 0,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.40826</u> 54,52	<u>0.04421</u> 10,374	<u>0.45247</u> 64,894
06-06-04	Налагодження системи блискавкозахисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02304</u> 4,683	<u>0.02304</u> 4,683	<u>0.00200</u> 0,471	<u>0.02504</u> 5,154
06-06-05	опалення та вентиляцію	<u>0.12384</u> 18,023	<u>-</u> -	<u>0.00242</u> 0,374	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12626</u> 18,397	<u>0.01288</u> 3,022	<u>0.13914</u> 21,419
06-06-06	водопровід та каналізація згідно креслення ТОМ 10.8 03 24-8-Р. ВК Котельня Водопостачання та каналізація	<u>0.28591</u> 43,577	<u>0.03720</u> 5,206	<u>0.00657</u> 0,951	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32968</u> 49,734	<u>0.03329</u> 7,81	<u>0.36297</u> 57,544
06-06-07	теплотехнічна частина	<u>2.36806</u> 349,879	<u>0.01474</u> 2,156	<u>0.00770</u> 1,161	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.39050</u> 353,196	<u>0.23604</u> 55,403	<u>2.62654</u> 408,599
06-06-09	придбання устаткування придбання обладнання до теплотехнічної частини	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-06-010	автоматизацію теплотехнічних рішень	<u>0.00612</u> 0,955	<u>0.40604</u> 59,487	<u>0.02014</u> 3,146	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.43230</u> 63,588	<u>0.04005</u> 9,4	<u>0.47235</u> 72,988

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-06-011	придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-06-012	електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>0.53132</u> 78,286	<u>0.02417</u> 3,867	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.55549</u> 82,153	<u>0.05388</u> 12,647	<u>0.60937</u> 94,8
06-06-013	газопостачання внутрішнє	<u>0.04515</u> 6,902	<u>0.04320</u> 6,615	<u>0.00255</u> 0,404	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09090</u> 13,921	<u>0.00818</u> 1,921	<u>0.09908</u> 15,842
06-06-014	придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-06-015	пуско-налагоджувальні роботи котельного обладнання та внутрішнього газопостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.06200</u> 215,841	<u>1.06200</u> 215,841	<u>0.09239</u> 21,683	<u>1.15439</u> 237,524
-	Разом по розділу:	<u>3.13687</u> 459,554	<u>1.23232</u> 180,707	<u>0.06765</u> 10,527	<u>-</u> -	<u>1.08504</u> 220,524	<u>5.52188</u> 871,312	<u>0.53240</u> 124,956	<u>6.05428</u> 996,268
	Пожежна безпека та оповіщення								
06-06-016	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0.12262</u> 17,858	<u>0.00018</u> 0,024	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12280</u> 17,882	<u>0.01153</u> 2,709	<u>0.13433</u> 20,591
06-06-017	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-06-018	Налагодження системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01921</u> 3,904	<u>0.01921</u> 3,904	<u>0.00168</u> 0,393	<u>0.02089</u> 4,297
06-06-019	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>0.27772</u> 40,516	<u>0.00014</u> 0,018	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27786</u> 40,534	<u>0.02479</u> 5,82	<u>0.30265</u> 46,354
06-06-020	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-06-021	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01052</u> 2,138	<u>0.01052</u> 2,138	<u>0.00092</u> 0,215	<u>0.01144</u> 2,353
06-06-022	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>0.37387</u> 54,094	<u>0.00027</u> 0,036	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.37414</u> 54,13	<u>0.03491</u> 8,191	<u>0.40905</u> 62,321

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-06-023	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
06-06-024	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	0.02200 4,471	0.02200 4,471	0.00191 0,449	0.02391 4,92
-	Разом по розділу:	-	0.77421 112,468	0.00059 0,078	-	0.05173 10,513	0.82653 123,059	0.07574 17,777	0.90227 140,836
-	Разом :	8.40838 1237,571	2.00653 293,175	0.33845 54,824	0.01062 1,778	1.13677 231,037	11.90075 1818,385	1.26564 297,044	13.16639 2115,429

Склав



Стецюк О.В.

Перевіряю



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07/*

на будівництво : Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта 19327,122 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 10,15513 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1575,043 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-07-01	на Архітектурно-будівельні рішення	5309,849	-	5309,849	5,84901	905,611	-
2	06-07-02	на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	5412,626	-	5412,626	0,90910	140,949	-
3	06-07-03	на Резервуари	1546,095	-	1546,095	1,50755	231,534	-
4	06-07-04	на придбання устаткування придбання резервуарів	-	5328,627	5328,627	-	-	-
5	06-07-05	на ЕТР	1290,114	108,722	1398,836	1,81411	285,225	-
6	06-07-07	на Вентиляція та кондиціонування	125,037	206,052	331,089	0,07536	11,724	-
-	-	Всього:	13683,721	5643,401	19327,122	10,15513	1575,043	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-07/*

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-01	Архітектурно-будівельні рішення	<u>4.87626</u> 701,476	<u>-</u> -	<u>0.32215</u> 53,262	<u>0.02702</u> 4,525	<u>-</u> -	<u>5.22543</u> 759,263	<u>0.62358</u> 146,348	<u>5.84901</u> 905,611
06-07-02	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	<u>0.65681</u> 93,243	<u>-</u> -	<u>0.12828</u> 21,516	<u>0.04341</u> 7,27	<u>-</u> -	<u>0.82850</u> 122,029	<u>0.08060</u> 18,92	<u>0.90910</u> 140,949
06-07-03	Резервуари	<u>0.93068</u> 125,48	<u>0.11760</u> 17,808	<u>0.21575</u> 36,903	<u>0.08643</u> 14,474	<u>-</u> -	<u>1.35046</u> 194,665	<u>0.15709</u> 36,869	<u>1.50755</u> 231,534
06-07-04	придбання устаткування придбання резервуарів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-07-05	ЕТР	<u>0.10435</u> 13,457	<u>1.35836</u> 201,807	<u>0.19581</u> 33,733	<u>0.00421</u> 0,706	<u>-</u> -	<u>1.66273</u> 249,703	<u>0.15138</u> 35,522	<u>1.81411</u> 285,225
06-07-07	Вентиляція та кондиціонування	<u>0.06322</u> 9,195	<u>0.00160</u> 0,242	<u>0.00340</u> 0,609	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06822</u> 10,046	<u>0.00714</u> 1,678	<u>0.07536</u> 11,724
-	Разом :	<u>6.63132</u> 942,851	<u>1.47756</u> 219,857	<u>0.86539</u> 146,023	<u>0.16107</u> 26,975	<u>-</u> -	<u>9.13534</u> 1335,706	<u>1.01979</u> 239,337	<u>10.15513</u> 1575,043

Дербін С.В.



"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 11461,631 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 8,36951 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1326,374 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-08-01	на Зовнішні теплові мережі	11461,631	-	11461,631	8,36951	1326,374	-
-	-	Всього:	11461,631	-	11461,631	8,36951	1326,374	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-08-01	Зовнішні теплові мережі	<u>6.44731</u> 964,469	<u>0.05269</u> 7,794	<u>1.05289</u> 167,315	<u>0.07216</u> 12,084	<u>-</u> -	<u>7.62505</u> 1151,662	<u>0.74446</u> 174,712	<u>8.36951</u> 1326,374
-	Разом :	<u>6.44731</u> 964,469	<u>0.05269</u> 7,794	<u>1.05289</u> 167,315	<u>0.07216</u> 12,084	<u>-</u> -	<u>7.62505</u> 1151,662	<u>0.74446</u> 174,712	<u>8.36951</u> 1326,374

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-09

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс


Кошторисна вартість об'єкта	1299,989 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,04250 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	160,384 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м.п.
Будівельні обсяги	1253,000 м.п.

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-09-01	на газопостачання зовнішнє	1131,609	-	1131,609	0,97619	146,74	0,903
2	06-09-02	на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	-	151,144	151,144	-	-	0,121
3	06-09-03	на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	17,236	-	17,236	0,06631	13,644	0,014
-	-	Всього:	1148,845	151,144	1299,989	1,04250	160,384	1,038

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-09-01	газопостачання зовнішнє	<u>0.66777</u> 91,367	<u>0.06161</u> 9,236	<u>0.14410</u> 22,749	<u>0.01071</u> 1,793	- -	<u>0.88419</u> 125,145	<u>0.09200</u> 21,595	<u>0.97619</u> 146,74
06-09-02	придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-09-03	пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання	- -	- -	- -	- -	<u>0.06100</u> 12,398	<u>0.06100</u> 12,398	<u>0.00531</u> 1,246	<u>0.06631</u> 13,644
-	Разом :	<u>0.66777</u> 91,367	<u>0.06161</u> 9,236	<u>0.14410</u> 22,749	<u>0.01071</u> 1,793	<u>0.06100</u> 12,398	<u>0.94519</u> 137,543	<u>0.09731</u> 22,841	<u>1.04250</u> 160,384

Склав



Стецюк О.В.

Перевіряю



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-010

на будівництво : Штучна водойма. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-011

на будівництво : Дренаж. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]
 _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]
 _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]
 _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]


Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-011

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав

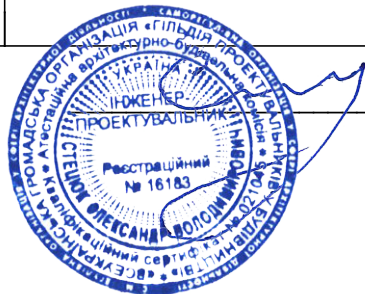

Стецюк О.В.

Перевіряю



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-012

на будівництво : Дренаж. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 5037,604 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,08327 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1375,744 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-012-01	на дренаж 2 пусковий комплекс	5037,604	-	5037,604	9,08327	1375,744	-
-	-	Всього:	5037,604	-	5037,604	9,08327	1375,744	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-012

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-012-01	дренаж 2 пусковий комплекс	<u>5.34960</u> 689,243	<u>-</u> -	<u>1.58335</u> 261,208	<u>1.18100</u> 197,787	<u>-</u> -	<u>8.11395</u> 1148,238	<u>0.96932</u> 227,506	<u>9.08327</u> 1375,744
-	Разом :	<u>5.34960</u> 689,243	<u>-</u> -	<u>1.58335</u> 261,208	<u>1.18100</u> 197,787	<u>-</u> -	<u>8.11395</u> 1148,238	<u>0.96932</u> 227,506	<u>9.08327</u> 1375,744

Склад



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Україна * м.Одеса
ПРИВАТНЕ
ВІДПРИЄМСТВО
"ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ"

Україна *
ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
ТЕХНІКО-ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПОСЛУГОВОГО ТОВАРИСТВА
№ 16183

Україна *
Архітектор
Регістраційний № 4491
ДЕРБІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Кваліфікаційний сертифікат № 00447

Національна комісія з питань захисту прав споживачів

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-013

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-013-01	Штучна водойма 2 пусковий	<u>0.53620</u> 71,444	<u>-</u> -	<u>0.10165</u> 17,756	<u>0.07147</u> 11,969	<u>-</u> -	<u>0.70932</u> 101,169	<u>0.08524</u> 20,006	<u>0.79456</u> 121,175
06-013-02	Водопропускна труба	<u>0.44634</u> 61,254	<u>-</u> -	<u>0.30787</u> 57,137	<u>0.00330</u> 0,552	<u>-</u> -	<u>0.75751</u> 118,943	<u>0.09521</u> 22,346	<u>0.85272</u> 141,289
-	Разом :	<u>0.98254</u> 132,698	<u>-</u> -	<u>0.40952</u> 74,893	<u>0.07477</u> 12,521	<u>-</u> -	<u>1.46683</u> 220,112	<u>0.18045</u> 42,352	<u>1.64728</u> 262,464

Склад



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Котельня. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 23983,805 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 13,15923 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2118,673 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	Будівельні роботи на Загальнобудівельні роботи	10370,624	-	10370,624	6,19072	979,108	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	10370,624	-	10370,624	6,19072	979,108	-
		Внутрішні мережі						
2	07-01-02	на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	89,238	-	89,238	0,11293	17,504	-
3	07-01-03	на Монтаж системи блискавкозахисту	174,367	-	174,367	0,45247	64,894	-
4	07-01-04	на Налагодження системи блискавкозахисту	6,51	-	6,51	0,02504	5,154	-
5	07-01-05	на опалення та вентиляцію	160,086	-	160,086	0,13914	21,419	-
6	07-01-06	на водопровід та каналізація згідно креслення ТОМ 10.8 03 24-8-Р.ВК Котельня Водопостачання та каналізація	640,673	-	640,673	0,36297	57,544	-
7	07-01-07	на тепломеханічна частина	3927,766	-	3927,766	2,62654	408,599	-
8	07-01-09	на придбання устаткування придбання обладнання до тепломеханічної частини	0,877	5987,028	5987,905	-	-	-
9	07-01-010	на автоматизацію тепломеханічних рішень	290,458	-	290,458	0,47235	72,988	-
10	07-01-011	на придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень	-	1051,657	1051,657	-	-	-
11	07-01-012	на електротехнічні рішення	400,453	-	400,453	0,60937	94,8	-
12	07-01-013	на газопостачання внутрішнє	111,241	-	111,241	0,09908	15,842	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	07-01-014	на придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	-	60,483	60,483	-	-	-
14	07-01-015	на пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	300,087	-	300,087	1,15439	237,524	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	6101,756	7099,168	13200,924	6,05428	996,268	-
15	07-01-016	Пожежна безпека та оповіщення на Монтаж системи пожежної сигналізації	39,881	-	39,881	0,13433	20,591	-
16	07-01-017	на придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	-	44,084	44,084	-	-	-
17	07-01-018	на Налагодження системи пожежної сигналізації	5,428	-	5,428	0,02089	4,297	-
18	07-01-019	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	109,657	-	109,657	0,30265	46,354	-
19	07-01-020	на придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	16,173	16,173	-	-	-
20	07-01-021	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	2,972	-	2,972	0,01144	2,353	-
21	07-01-022	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	132,755	-	132,755	0,40905	62,321	-
22	07-01-023	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	51,981	51,981	-	-	-
23	07-01-024	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	9,326	-	9,326	0,03587	7,381	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	300,019	112,238	412,257	0,91423	143,297	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	16772,399	7211,406	23983,805	13,15923	2118,673	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



[підпис, (ініціал, прізвище)]




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.

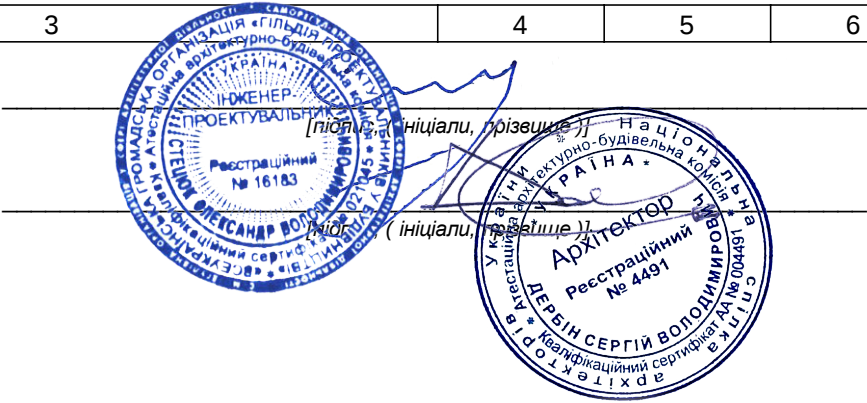

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Будівельні роботи								
07-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>5.27298</u> 782,475	<u>-</u> -	<u>0.25166</u> 41,025	<u>0.01062</u> 1,778	<u>-</u> -	<u>5.53526</u> 825,278	<u>0.65546</u> 153,83	<u>6.19072</u> 979,108
-	Разом по розділу:	<u>5.27298</u> 782,475	<u>-</u> -	<u>0.25166</u> 41,025	<u>0.01062</u> 1,778	<u>-</u> -	<u>5.53526</u> 825,278	<u>0.65546</u> 153,83	<u>6.19072</u> 979,108
	Внутрішні мережі								
07-01-02	Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>0.04506</u> 6,862	<u>0.05440</u> 7,81	<u>0.00399</u> 0,607	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10345</u> 15,279	<u>0.00948</u> 2,225	<u>0.11293</u> 17,504
07-01-03	Монтаж системи блискавкозахисту	<u>0.26273</u> 33,356	<u>0.14542</u> 21,147	<u>0.00011</u> 0,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.40826</u> 54,52	<u>0.04421</u> 10,374	<u>0.45247</u> 64,894
07-01-04	Налагодження системи блискавкозахисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02304</u> 4,683	<u>0.02304</u> 4,683	<u>0.00200</u> 0,471	<u>0.02504</u> 5,154
07-01-05	опалення та вентиляцію	<u>0.12384</u> 18,023	<u>-</u> -	<u>0.00242</u> 0,374	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12626</u> 18,397	<u>0.01288</u> 3,022	<u>0.13914</u> 21,419
07-01-06	водопровід та каналізація згідно креслення ТОМ 10.8 03 24-8-Р. ВК Котельня Водопостачання та каналізація	<u>0.28591</u> 43,577	<u>0.03720</u> 5,206	<u>0.00657</u> 0,951	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32968</u> 49,734	<u>0.03329</u> 7,81	<u>0.36297</u> 57,544
07-01-07	теплотехнічна частина	<u>2.36806</u> 349,879	<u>0.01474</u> 2,156	<u>0.00770</u> 1,161	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.39050</u> 353,196	<u>0.23604</u> 55,403	<u>2.62654</u> 408,599
07-01-09	придбання устаткування придбання обладнання до теплотехнічної частини	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-01-010	автоматизацію теплотехнічних рішень	<u>0.00612</u> 0,955	<u>0.40604</u> 59,487	<u>0.02014</u> 3,146	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.43230</u> 63,588	<u>0.04005</u> 9,4	<u>0.47235</u> 72,988

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-011	придбання устаткування придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-01-012	електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>0.53132</u> 78,286	<u>0.02417</u> 3,867	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.55549</u> 82,153	<u>0.05388</u> 12,647	<u>0.60937</u> 94,8
07-01-013	газопостачання внутрішнє	<u>0.04515</u> 6,902	<u>0.04320</u> 6,615	<u>0.00255</u> 0,404	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09090</u> 13,921	<u>0.00818</u> 1,921	<u>0.09908</u> 15,842
07-01-014	придбання устаткування обладнання для газопостачання внутрішнього	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-01-015	пуско-налагоджувальні роботи внутрішнього газопостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.06200</u> 215,841	<u>1.06200</u> 215,841	<u>0.09239</u> 21,683	<u>1.15439</u> 237,524
-	Разом по розділу:	<u>3.13687</u> 459,554	<u>1.23232</u> 180,707	<u>0.06765</u> 10,527	<u>-</u> -	<u>1.08504</u> 220,524	<u>5.52188</u> 871,312	<u>0.53240</u> 124,956	<u>6.05428</u> 996,268
	Пожежна безпека та оповіщення								
07-01-016	Монтаж системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0.12262</u> 17,858	<u>0.00018</u> 0,024	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12280</u> 17,882	<u>0.01153</u> 2,709	<u>0.13433</u> 20,591
07-01-017	придбання устаткування Придбання обладнання системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-01-018	Налагодження системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01921</u> 3,904	<u>0.01921</u> 3,904	<u>0.00168</u> 0,393	<u>0.02089</u> 4,297
07-01-019	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>0.27772</u> 40,516	<u>0.00014</u> 0,018	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27786</u> 40,534	<u>0.02479</u> 5,82	<u>0.30265</u> 46,354
07-01-020	придбання устаткування Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-01-021	Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01052</u> 2,138	<u>0.01052</u> 2,138	<u>0.00092</u> 0,215	<u>0.01144</u> 2,353
07-01-022	Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>0.37387</u> 54,094	<u>0.00027</u> 0,036	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.37414</u> 54,13	<u>0.03491</u> 8,191	<u>0.40905</u> 62,321

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-023	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
07-01-024	Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	<u>0.03300</u> 6,707	<u>0.03300</u> 6,707	<u>0.00287</u> 0,674	<u>0.03587</u> 7,381
-	Разом по розділу:	-	<u>0.77421</u> 112,468	<u>0.00059</u> 0,078	-	<u>0.06273</u> 12,749	<u>0.83753</u> 125,295	<u>0.07670</u> 18,002	<u>0.91423</u> 143,297
-	Разом :	<u>8.40985</u> 1242,029	<u>2.00653</u> 293,175	<u>0.31990</u> 51,63	<u>0.01062</u> 1,778	<u>1.14777</u> 233,273	<u>11.89467</u> 1821,885	<u>1.26456</u> 296,788	<u>13.15923</u> 2118,673

Склав



Стецюк О.В.

Перевіряв



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 22097,347 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,64524 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1817,821 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Архітектурно-будівельні рішення	5395,028	-	5395,028	5,84901	905,611	-
2	07-02-02	на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	5412,626	-	5412,626	0,90910	140,949	-
3	07-02-03	на Резервуари	1546,095	-	1546,095	1,50755	231,534	-
4	07-02-04	на придбання устаткування придбання резервуарів	-	5328,627	5328,627	-	-	-
5	07-02-05	на ЕТР	1339,724	75,55	1415,274	1,86941	293,83	-
6	07-02-06	на Благоустрій	2668,608	-	2668,608	1,43481	234,173	-
7	07-02-07	на Вентиляція та кондиціонування	125,037	206,052	331,089	0,07536	11,724	-
-	-	Всього:	16487,118	5610,229	22097,347	11,64524	1817,821	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив


Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Архітектурно-будівельні рішення	<u>4.87626</u> 701,476	<u>-</u> -	<u>0.32215</u> 53,262	<u>0.02702</u> 4,525	<u>-</u> -	<u>5.22543</u> 759,263	<u>0.62358</u> 146,348	<u>5.84901</u> 905,611
07-02-02	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	<u>0.65681</u> 93,243	<u>-</u> -	<u>0.12828</u> 21,516	<u>0.04341</u> 7,27	<u>-</u> -	<u>0.82850</u> 122,029	<u>0.08060</u> 18,92	<u>0.90910</u> 140,949
07-02-03	Резервуари	<u>0.93068</u> 125,48	<u>0.11760</u> 17,808	<u>0.21575</u> 36,903	<u>0.08643</u> 14,474	<u>-</u> -	<u>1.35046</u> 194,665	<u>0.15709</u> 36,869	<u>1.50755</u> 231,534
07-02-04	придбання устаткування придбання резервуарів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-02-05	ЕТР	<u>0.11067</u> 14,304	<u>1.35836</u> 201,807	<u>0.23886</u> 40,101	<u>0.00421</u> 0,706	<u>-</u> -	<u>1.71210</u> 256,918	<u>0.15731</u> 36,912	<u>1.86941</u> 293,83
07-02-06	Благоустрій	<u>0.96052</u> 138,78	<u>-</u> -	<u>0.25266</u> 48,139	<u>0.07081</u> 11,859	<u>-</u> -	<u>1.28399</u> 198,778	<u>0.15082</u> 35,395	<u>1.43481</u> 234,173
07-02-07	Вентиляція та кондиціювання	<u>0.06322</u> 9,195	<u>0.00160</u> 0,242	<u>0.00340</u> 0,609	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06822</u> 10,046	<u>0.00714</u> 1,678	<u>0.07536</u> 11,724
-	Разом :	<u>7.59816</u> 1082,478	<u>1.47756</u> 219,857	<u>1.16110</u> 200,53	<u>0.23188</u> 38,834	<u>-</u> -	<u>10.46870</u> 1541,699	<u>1.17654</u> 276,122	<u>11.64524</u> 1817,821

Склад



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Благоустрій. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склад



Стецюк О.В.

Перевірив

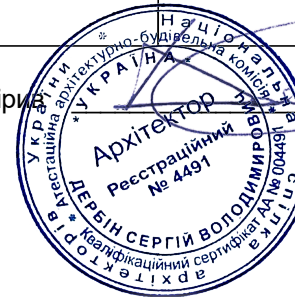

Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Благоустрій. 2 пусковий комплекс


Кошторисна вартість об'єкта 364991,980 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 400,00179 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 62096,488 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на благоустрій. 2 пусковий комплекс	353791,023	-	353791,023	397,85142	61753,962	-
2	07-04-02	на зарядна станція для електроавтомобілів. 2 пусковий комплекс	102,653	-	102,653	0,24332	36,213	-
3	07-04-04	на інші елементи благоустрою. 2 пусковий комплекс	1407,494	-	1407,494	0,40228	61,796	-
4	07-04-05	на Влаштування кургану під стеллу. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи)	147,208	-	147,208	0,06996	10,344	-
5	07-04-06	на придбання устаткування придбання устаткування. 2 пусковий комплекс	-	6874,994	6874,994	-	-	-
6	07-04-07	на Благоустрій насосної станції- 2 ПК	2668,608	-	2668,608	1,43481	234,173	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	358116,986	6874,994	364991,98	400,00179	62096,488	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник




1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.

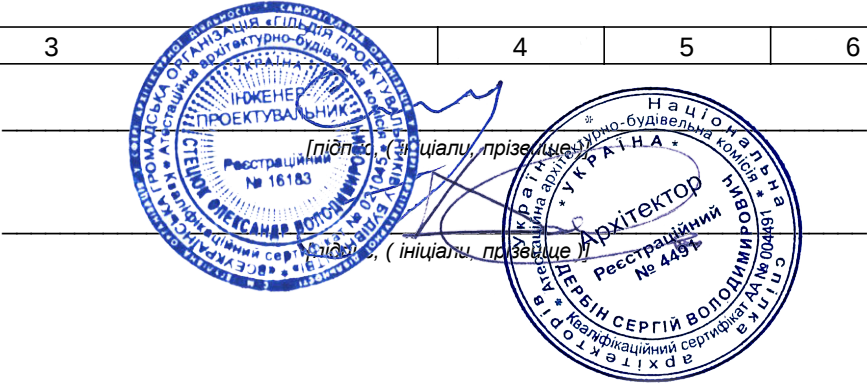

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	благоустрій. 2 пусковий комплекс	<u>339,27626</u> 49194,829	<u>-</u> -	<u>11,23736</u> 1814,015	<u>5,42117</u> 908,013	<u>-</u> -	<u>355,93479</u> 51916,857	<u>41,91663</u> 9837,105	<u>397,85142</u> 61753,962
07-04-02	зарядна станція для електроавтомобілів. 2 пусковий комплекс	<u>0,04769</u> 6,573	<u>0,16380</u> 22,824	<u>0,01106</u> 2,004	<u>0,00091</u> 0,153	<u>-</u> -	<u>0,22346</u> 31,554	<u>0,01986</u> 4,659	<u>0,24332</u> 36,213
07-04-04	Інші елементи благоустрою. 2 пусковий комплекс	<u>0,29913</u> 41,489	<u>0,02380</u> 3,521	<u>0,03278</u> 6,024	<u>0,00251</u> 0,42	<u>-</u> -	<u>0,35822</u> 51,454	<u>0,04406</u> 10,342	<u>0,40228</u> 61,796
07-04-05	Влаштування кургану під стеллу. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи)	<u>0,03082</u> 4,065	<u>0,03200</u> 4,625	<u>0,00045</u> 0,087	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06327</u> 8,777	<u>0,00669</u> 1,567	<u>0,06996</u> 10,344
07-04-06	придбання устаткування придбання устаткування. 2 пусковий комплекс	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-04-07	Благоустрій насосної станції- 2 ПК	<u>0,96052</u> 138,78	<u>-</u> -	<u>0,25266</u> 48,139	<u>0,07081</u> 11,859	<u>-</u> -	<u>1,28399</u> 198,778	<u>0,15082</u> 35,395	<u>1,43481</u> 234,173
-	Разом :	<u>340,61442</u> 49385,736	<u>0,21960</u> 30,97	<u>11,53431</u> 1870,269	<u>5,49540</u> 920,445	<u>-</u> -	<u>357,86373</u> 52207,42	<u>42,13806</u> 9889,068	<u>400,00179</u> 62096,488

Склад



Стецюк О.В.

Перевіряє



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Корикування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Огорожа території. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
-		Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад


Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав



Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

Кошторисна вартість об'єкта	60456,294 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	35,69578 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5445,253 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-06-01	на огорожа території з центральними воротами	60266,274	-	60266,274	35,69578	5445,253	-
2	07-06-02	на придбання устаткування придбання устаткування для влаштування відкатних воріт	-	190,02	190,02	-	-	-
--								
-		Всього:	60266,274	190,02	60456,294	35,69578	5445,253	-

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[Група: (інше та прізвище)]

Підпис (імя та прізвище) _____


Гіюнас, (ініціали, прізвище)

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	огорожа території з центральними воротами	<u>30.64880</u> 4337,417	<u>0.01920</u> 2,84	<u>1.08315</u> 185,912	<u>0.09881</u> 16,55	- -	<u>31.84996</u> 4542,719	<u>3.84582</u> 902,534	<u>35.69578</u> 5445,253
07-06-02	придбання устаткування для влаштування відкатних воріт	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>30.64880</u> 4337,417	<u>0.01920</u> 2,84	<u>1.08315</u> 185,912	<u>0.09881</u> 16,55	- -	<u>31.84996</u> 4542,719	<u>3.84582</u> 902,534	<u>35.69578</u> 5445,253

Склад

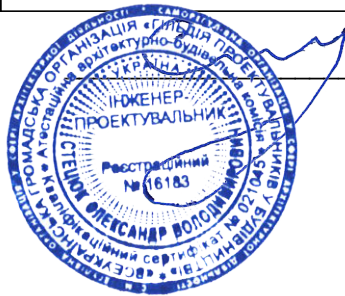

Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07

на будівництво : Озеленення території. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
-		Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад


Перевірив

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

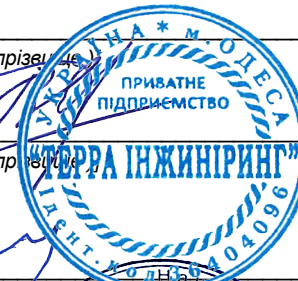

Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав



Стецюк О.В.

Перевіряю



Дербін С.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-08-01	озеленення території	<u>25.44156</u> 3240,976	<u>-</u> -	<u>0.16717</u> 28,859	<u>2.49966</u> 418,678	<u>-</u> -	<u>28.10839</u> 3688,513	<u>2.55352</u> 599,236	<u>30.66191</u> 4287,749
07-08-02	Озеленення території. (додаткові роботи 1)	<u>16.74435</u> 2026,52	<u>-</u> -	<u>0.49638</u> 77,576	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>17.24073</u> 2104,096	<u>1.54374</u> 362,285	<u>18.78447</u> 2466,381
07-08-03	Озеленення території. (додаткові роботи 2)	<u>0.84744</u> 102,571	<u>-</u> -	<u>0.02504</u> 3,913	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.87248</u> 106,484	<u>0.07812</u> 18,33	<u>0.95060</u> 124,814
-	Разом :	<u>43.03335</u> 5370,067	<u>-</u> -	<u>0.68859</u> 110,348	<u>2.49966</u> 418,678	<u>-</u> -	<u>46.22160</u> 5899,093	<u>4.17538</u> 979,851	<u>50.39698</u> 6878,944

Склав



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-09

на будівництво : Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта 47734,531 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 30,52403 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4751,249 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-09-01	на зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	39155,773	-	39155,773	24,63909	3843,899	-
2	07-09-02	на придбання устаткування придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	-	202,974	202,974	-	-	-
3	07-09-03	на зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс	8375,784	-	8375,784	5,88494	907,35	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	47531,557	202,974	47734,531	30,52403	4751,249	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник



1	2	3	4	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-09-01	зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	<u>7.33881</u> 974,05	<u>11.07709</u> 1639,183	<u>3.77891</u> 665,734	<u>0.12940</u> 21,671	-	<u>22.32421</u> 3300,638	<u>2.31488</u> 543,261	<u>24.63909</u> 3843,899
07-09-02	придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-
07-09-03	зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс	<u>2.25640</u> 300,491	<u>2.37344</u> 353,46	<u>0.62506</u> 109,702	<u>0.06207</u> 10,395	-	<u>5.31697</u> 774,048	<u>0.56797</u> 133,302	<u>5.88494</u> 907,35
-	Разом :	<u>9.59521</u> 1274,541	<u>13.45053</u> 1992,643	<u>4.40397</u> 775,436	<u>0.19147</u> 32,066	-	<u>27.64118</u> 4074,686	<u>2.88285</u> 676,563	<u>30.52403</u> 4751,249

Склад



Стецюк О.В.

Перевіряє



Дербін С.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Стецюк О.В.

Дербін С.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склад

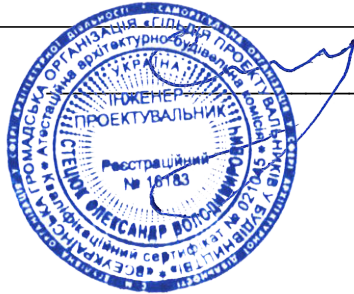

Стецюк О.В.

Перевірів



Дербін С.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-02

на будівництво : Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об'єкта	3989,783 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,78274 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	300,382 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-02-01	на Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	3989,783	-	3989,783	1,78274	300,382	-
-	-	Всього:	3989,783	-	3989,783	1,78274	300,382	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :		-	681,17	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник




1	2	3	4	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Стецюк О.В.

Перевірив

Дербін С.В.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-02-01	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	<u>0.72001</u> 94,299	<u>-</u> -	<u>0.68475</u> 128,938	<u>0.17198</u> 28,805	<u>-</u> -	<u>1.57674</u> 252,042	<u>0.20600</u> 48,34	<u>1.78274</u> 300,382
-	Разом :	<u>0.72001</u> 94,299	<u>-</u> -	<u>0.68475</u> 128,938	<u>0.17198</u> 28,805	<u>-</u> -	<u>1.57674</u> 252,042	<u>0.20600</u> 48,34	<u>1.78274</u> 300,382

Склав



Стецюк О.В.

Перевірив



Дербін С.В.
